



AVANCE OPERACIÓN MOCOA

EVENTO: AVENIDA TORRENCIAL

Marzo 31 de 2017 /11:24p.m.

MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO



GOBIERNO DE COLOMBIA

Reporte: 28 de Febrero de 2018

1. Balance de Afectación

EVENTO QUE SE PRESENTÓ

Avenida Torrencial ocasionada por el aumento de los niveles de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, en el municipio de Mocoa.

MARCO LEGAL

- Decreto de Desastre para el Municipio de Mocoa No. 599, expedido por el señor Presidente.
- Decreto de Estado Emergencia Económica, Social y Ecológica No. 601, expedido por el señor Presidente.
- Decreto de Calamidad Pública Departamental No. 068 expedido por la Gobernadora
- Decreto de Calamidad Pública Municipal No. 056, expedido por el Alcalde



Puesto de Mando Unificado

PERSONAS

Heridos	398
Fallecidos*	333
Cuerpos Entregados a las Familias	300
Desaparecidos	76
Familias Registradas en el RUD	7.794
Personas Registradas en el RUD	22.310

INFRAESTRUCTURA

Barrios Afectados	48
Subestación Eléctrica	1
Acueductos	2
Red de Gas	1
Kilómetros de Vías	11.58
Puentes Destruídos	2
Puentes Averíados	3
Viviendas Afectadas	1.461
Hectáreas Rurales	486,3

* Fuente: Medicina Legal

2. Fases del Proceso



2.1 RESPUESTA
(18 Días)

100%

ABRIL 2017

2.2 ESTABILIZACIÓN
(90 Días)

100%

JULIO 2017

**2.3 RECUPERACIÓN -
RECONSTRUCCIÓN**
(3 AÑOS)

2017 –2020

**Todo el proceso se adelanta con el acompañamiento de Procuraduría,
Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y Contraloría**

2.1 Fase de Respuesta

ACTIVACIÓN INMEDIATA

Activación del Protocolo de Respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en cabeza del señor Presidente de la República.

PUESTO DE MANDO UNIFICADO

Activación del Puesto de Mando Unificado en menos de 8 horas	120 Reuniones Realizadas
Miembros del SNGRD que operaron	Más de 2.300
Personas Atendidas en los Puestos de Información	Más de 10.000

ASISTENCIA HUMANITARIA

AHE Alimentaria y No Alimentaria (Mercados, Kits de Aseo, Frazadas, Colchonetas, Kits de Cocina)	2.540 Toneladas Entregadas al 100%
--	---

APOYO EXEQUIAL

Apoyos Exequiales entregados	297 allecidos
------------------------------	----------------------

FASE DE RESPUESTA

100%

EN 18 DÍAS DE OPERACIÓN



SALUD

Dosis de Vacunas Aplicadas (Tétano, Hepatitis A y Varicela)	57.945
Vacunas Aplicadas Animales	1.639

ENERGÍA

Energía habilitada el día 11 con una subestación provisional	100%
--	-------------

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Restablecimiento de Telefonía y datos	100%
---------------------------------------	-------------



Asistencia Humanitaria de Emergencia

2.2 Fase de Estabilización

AGUA Y SANEAMIENTO

Litros de Agua Entregados

Más de 88 millones

Litros de Agua Entregados por Día

1 millón

Se utilizaron más de **40 Carrotanques** en la operación, Plantas Potabilizadoras, Motobombas y Tanques de Almacenamiento.

Hoy 3 Carrotanques se encuentran disponibles

ALBERGUES TEMPORALES

Personas que estuvieron en los Albergues

4.561

Albergues que fueron Habilitados y Administrados

9

SUBSIDIOS DE ARRIENDO

Subsidios de Arriendo Entregados

4.448

FASE DE ESTABILIZACIÓN

100%

90 días



TRANSPORTE Y TRASLADOS

Personas que fueron trasladadas a otras ciudades con el apoyo de Cancillería y OIM

765

MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO

Equipos de Maquinaria Amarilla que fueron utilizados en la operación **208**

Se utilizaron **51.642 Horas Máquina** para la rehabilitación de vías, remoción de escombros, limpieza de calles y colegios, dragados y reconfiguración de cauce de los ríos y quebradas.

INFRAESTRUCTURA

Puentes Vehiculares habilitados (1 Puente Militar) **4**

Vías Nacionales Habilitadas **3**

AGUA

Bocatomas Rehabilitadas **4**

Zona con Disponibilidad de Agua Potable terminada (Suroccidente) **1**

Zonas con Disponibilidad de Agua Cruda (Centro, Barrios Unidos y Norte) **3**

Suministro de materiales-UNGRD, Soporte Técnico-MinVivienda, Logística- Ejercito Nacional

EDUCACIÓN

Sedes Educativas Habilitadas **57**

Aulas Móviles Instaladas **8**

Kits Escolares Entregados **14 mil**

COMERCIO

Comerciantes Caracterizados **354**

Exención del IVA



CULTURA

Libros y lámparas entregadas a niños	2.056
Jornadas Socioculturales	61

AMBIENTE

Elaboración del Mapa de Zonificación de Riesgo (Mesa Técnica de Ambiente)	1
---	----------

EMPLEO Y CAPACITACIÓN

Empleos Generados: (Remoción de Escombros, Manejo de Maquinaria)	270
--	------------

NIÑEZ

Suplemento Alimenticio para Niños y Madres Gestantes	47 Toneladas entregadas
--	--------------------------------

CONTINUAMOS EN ...

- Pago de subsidios de arriendos semestre anticipado y paquete alimentario cada mes.

OPERACIÓN DE LA OFICINA DEL GOBIERNO NACIONAL PERMANENTE EN MOCOA - OGN



2.3 Fase de Reconstrucción

\$ 1,2 billones

Periodo: 2017-2022

Departamento Nacional de Planeación

✓ Comprende **122 acciones** en 6 líneas de acción estratégicas:

- Ordenamiento Territorial, Ambiente y Gestión del Riesgo.
- Infraestructura Social.
- Conectividad e Integración Regional.
- Desarrollo Económico.
- Desarrollo Social.
- Desarrollo Institucional.

PLAN PARA LA
RECONSTRUCCIÓN
DE
MOCOA
2017-2022

Documento
CONPES

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

3904

**MINISTERIO DE
VIVIENDA, CIUDAD
Y TERRITORIO**



1.209 Viviendas Urbanas

Fase 1: 300 Viviendas, Sauces I.

\$ 22.260 millones

Tiempo de ejecución:

1 año
(Mayo 2017- Mayo 2018)

Avance:

- ✓ Cronograma de terminación de viviendas:

Mes-2018	N° Viviendas
Marzo	100
Mayo	200
Total	300

- ✓ Se dio inicio a la convocatoria para la postulación de familias al subsidio de vivienda, por MinVivienda.

Compromisos:

- Entrega de las primeras **100 viviendas** el 1 de abril de 2018-MinVivienda



Avance Construcción Fase I Vivienda Urbana – Los Sauces I



Avance Construcción Fase I Vivienda Urbana – Los Sauces I

Fase 2: 909 viviendas, Sauces II.

\$60.448 millones

Tiempo de ejecución:

18 meses
(Marzo 2018-
Septiembre 2019)

Avance:

- ✓ Adquisición del predio Sauces II de 16.93 Hectáreas, por expropiación.
- ✓ La construcción se adelantará en dos frentes de trabajo:

1. Construcción de 528 viviendas
2. Construcción de 381 viviendas

Compromisos:

- En una semana contratar la obra e interventoría, por MinVivienda y la UNGRD



Predio - Sauces II

■ Construcción del Sistema de Acueducto

\$28.074 millones

Tiempo de ejecución: 12 meses

Avance:

- ✓ 100% la bocatoma alterna.
- ✓ Apoyo logístico del ejercito para cumplir con la bocatoma alterna
- ✓ 60,5% de avance físico en la instalación de redes.
- ✓ Se avanza en la construcción de las líneas de conducción de agua tratada sectores Norte y Suroccidente.
- ✓ 8,489 metros lineales instalados de redes de acueducto.

Compromisos:

- Iniciar con las obras de rehabilitación de la estructura de captación existente.

• Plan Maestro de Alcantarillado

\$91.200 millones

Avance:

- ✓ En febrero de 2018 se firmó minuta para suscribir el contrato de préstamo con el BID.



Bocatoma Alterna Terminada



Transporte Materiales para Bocatoma Alterna

\$ 4.473 millones

Fecha de Finalización Julio de 2018

Avance:

- ✓ 2% de avance físico de la obra.

Compromisos:

- Se adelanta el proceso de adquisición de la dotación del CDI – UNGRD, con los recursos donados por “Give To Colombia”.



Render CDI

**MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL**

252 viviendas.

\$13.467 millones

Plazo de Ejecución

18 meses

Avance:

- ✓ Se identificó predio de 25 hectáreas, ubicado en la vereda Los Recuerdos.
- ✓ Se solicitó el avalúo del predio por al IGAC, el día 5 de febrero de 2018.

Compromisos:

- Entrega del avalúo por parte del IGAC.
- Una vez se tenga el avalúo la UNGRD adelantará la adquisición del Predio.



Predio – Los Recuerdos

NOTA

- De acuerdo con la solicitud del Alcalde, se destinarán 6 hectáreas para la construcción de soluciones de vivienda por parte de la Corporación Antioquia Presente en alianza con El Minuto de Dios.

\$ 1.000 millones

Tiempo de ejecución 6 meses
(Febrero-Agosto 2018)

Avance:

- ✓ 180 familias a ser beneficiadas.
- ✓ Se suscribió convenio entre el FNGRD, MinAgricultura y la Alcaldía.
- ✓ Componentes del proyectos:
 - Avicultura.
 - Cítricos.
 - Plátano.
 - Aguacate.
 - Asistencia Técnica.
 - Suministro de Herramientas y Equipos.
- ✓ El día 27 de febrero de 2018, se dio inicio a la ejecución del convenio.

PROSPERIDAD SOCIAL

\$8.100 millones

29 meses
(Diciembre 2017 a
Marzo de 2020)

Tiempo de ejecución:

Avance:

- ✓ Se adquirió el predio Santa Mónica de 2 hectáreas, por proceso de expropiación.
- ✓ Se suscribió convenio entre Prosperidad Social y la UNGRD para la construcción.
- ✓ Prosperidad Social entregó los insumos técnicos para la estructuración de estudios y diseños.
- ✓ la UNGRD adelanta el proceso contractual de los estudios, diseños, ejecución de la obra y urbanismo (Plaza de mercado, vías de acceso y adecuación de servicios públicos).

Compromisos:

- Aprobación del Plan Operativo de Ejecución del convenio por parte del DPS, para iniciar las obras.



Predio Santa Mónica

300 viviendas

\$4.972 millones

Plazo de Ejecución

6 meses

Avance:

- ✓ Convenio con el operador UNOPS, para la ejecución del proyecto en tres etapas:
 - **1era Etapa:** 120 viviendas.
Duración: 3,5 meses (Febrero - Mayo 2018)
 - **2da Etapa:** 100 viviendas.
Duración: 3 meses (Marzo - Mayo 2018)
 - **3ra Etapa:** 80 viviendas.
Duración: 2,5 meses (Mayo - Julio 2018).
- ✓ La Alcaldía expidió la certificación de habitabilidad de 190 viviendas (120 de la Primera Etapa y 70 de la Segunda Etapa).

Compromisos:

- Expedición de certificaciones de condiciones de habitabilidad de las viviendas restantes – Alcaldía.
- **1ra Etapa:** Auditoría visible para socialización con la comunidad y creación del Comité de Veeduría Ciudadana para seguimiento del proyecto – 01 de marzo. Inicio obras 02 de marzo.
- **2da Etapa:** Aprobación por parte del comité de estructuración - 27 de marzo.
- **3ra Etapa:** Aprobación por parte del comité de estructuración - 10 de abril.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

- **Construcción del Mega Colegio ubicado en el predio Sauces II.**

\$ 8.500 millones

Tiempo de ejecución: 14 meses
(Marzo-Mayo 2019)

Avance:

- ✓ Se suscribió convenio entre UNGRD y MinEducación.

Compromisos:

- A la espera de estudio de niveles del predio sauces II, para iniciar la contratación de la obra.



Área de Cesión Mega Colegio - Predio Sauces II

- **Construcción de 24 Aulas en 3 Instituciones Educativas**

\$ 8.500 millones

Tiempo de ejecución: 1 año
(Marzo-Marzo 2019)

Avance:

- ✓ Se suscribió convenio con Findeter.
- ✓ En proceso etapa de estudios y diseños.
- ✓ Las aulas son las siguientes:
 - 6 aulas en la institución educativa Pio XII
 - 10 aulas en la institución educativa Simón Bolívar
 - 8 aulas en la institución educativa rural Alto Afán

- **Mejoramiento de 9 Sedes Educativas**

\$ 2.897 millones

Tiempo de ejecución: 3 meses
(Mayo-Julio 2018)

Avance:

- ✓ Se suscribió convenio con Findeter .
- ✓ En proceso contratación de estudios y diseños.

- **Construcción del Centro Educativo Fray Placido por la Gobernación del Putumayo.**

\$ 7.500 millones

Tiempo de ejecución: 10 meses

Avance:

- ✓ En proceso contratación de estudios y diseños.

- **Intervención de 6 aulas del Centro Educativo Kamentsa por la Gobernación del Putumayo.**

\$ 1.180 millones

Fecha de finalización: Abril 2018

Avance:

✓ **59%** avance físico de la obra.

Compromisos:

Realizar visita técnica por parte del Ministerio a la institución educativa del resguardo indígena Inga sede Belén del Palmar en la vereda el Líbano, para la intervención de 5 aulas por valor de \$900 millones, de los cuales el MinEducación aportaría \$500 millones y la Gobernación \$400 millones.

- **Pilos Por Mocoa**

\$ 1.805 millones

Avance:

- ✓ En la cuarta convocatoria ingresaron 89 beneficiarios; 39 por puntaje nacional (igual o mayor a 348) y 51 por capítulo especial Mocoa (igual o mayor a 313).
- ✓ Los 51 cupos adicionales del capítulo especial “Pilos por Mocoa” se adjudicaron a jóvenes residentes de este municipio que cuentan con el puntaje SISBEN establecido en la convocatoria nacional y que cumplen con el puntaje mínimo establecido.

- **Congelación deudas Icetex**

\$ 26.800 millones

Avance:

- ✓ Congelamiento de intereses corrientes
- ✓ Los créditos otorgados para Mocoa que están congelados (suspendidos) benefician 2.294 estudiantes,

- **Atención Psicosocial**

Avance:

- ✓ Más de 500 profesores y 1.000 estudiantes atendidos con apoyo de aliados.
- ✓ Formación a más de 50 formadores y tutores.

MINISTERIO DE CULTURA

\$372 millones

Fecha de Finalización: Marzo de 2018

Avance:

✓ **98%** de avance físico en la construcción.

Acciones Pendientes:

- Carpintería (20%)
- Instalaciones eléctricas e iluminación (50%)
- Acabados (30%)
- Cerramiento 20%

Compromisos:

- Instalar la dotación de mobiliario y libros-MinCultura.



Avance construcción biblioteca

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Construcción y Dotación Hospital José María Hernández

\$33.826 millones

Fecha de Finalización: Marzo de 2020

Avance:

✓ **42%** de avance físico en la obra.

Compromisos:

- Definir los proyectos biomédicos a desarrollarse por el Ministerio de Salud.



Avance Construcción del Hospital José María Hernández

CANCILLERÍA

• Construcción Casa Lúdica Los Sauces I

\$ 800 millones

Tiempo de ejecución :

4.5 meses
(Marzo-Julio 2018)

Avance:

- ✓ Etapa de estudios y diseños culminada.
- ✓ Se dio inicio a las obras preliminares el día 12 de febrero de 2018 y se realizó el cerramiento del predio.



Avance Obras Preliminares Casa Lúdica

• Construcción de Cancha Múltiple Deportiva Los Sauces I

\$ 99 millones

Tiempo de ejecución :

4.5 meses
(Marzo-Julio 2018)

Avance:

- ✓ Se suscribió convenio suscrito entre la UNGRD, FUPAD y la Cancillería.
- ✓ Se entregó el predio a la cancillería para adelantar la obra.

Compromisos:

- Cancillería y FUPAD adelantar la contratación de la obra.

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

• Instalación del SAT

\$1.223 millones

Avance:

- ✓ **100%** de avance en la implementación del SAT.
- ✓ 1 puesto de monitoreo instalado
- ✓ 11 sensores de río colocados
- ✓ 4 estaciones meteorológicas instaladas
- ✓ 12 sirenas instaladas

• Estudios y diseños SAT

\$600 millones

Avance:

- ✓ **100%** terminado y entregado a la Alcaldía y al Coordinador del SAT financiado por la UNGRD, en convenio con la Universidad Javeriana.

• SAT Comunitario

\$205 millones

Avance:

- ✓ **100%** en la implementación del SAT comunitario.



SAT terminado y entregado

Rehabilitación Cancha Deportiva El Pepino y Salón Comunal

\$360 millones

Tiempo de ejecución:

3 meses
(Septiembre 2017 a
Diciembre 2017)

Avance:

✓ **100%** terminado y listo para entrega oficial.



Cancha Deportiva el Pepino



Cancha Deportiva el Pepino

\$413 millones

Tiempo de ejecución: 3 meses
(Enero-Marzo 2018)

Avance:

- ✓ 63% de avance físico en la adecuación de la cubierta y acceso peatonal al colegio, con los recursos donados por *Caracol TV (Yo me llamo)*.
- ✓ Se adelanta proceso de contratación de la dotación con recursos de *Caring For Colombia*.



Avance adecuación del Colegio Ciudad Mocoa

\$ 348 millones

Avance:

- ✓ **Puente Mulato:** 100% terminado.
- ✓ **Puente Villa Rosa – San Miguel:** 100% terminado.
- ✓ **Puente Dantayaco:** 100% terminado.
- ✓ **Puente San Agustín:** Para inicio de obra



Puente Mulato



Puente San Miguel

\$5.000 millones

Tiempo de ejecución:

18 meses
(Octubre 2017 - Marzo 2019)

Avance:

✓ 3 vías entregadas

Estado de la Pavimentación de Vías:


- ✓ **Victoria Regia** : 100% terminado
- ✓ **Pablo VI**: 100% terminado
- ✓ **La Brigada**: 80% (Marzo 2018)
- ✓ **Barrio Obrero Etapa 2**: 40% (Marzo 2018)
- ✓ **José Homero**: 5% (Marzo 2018)

Compromisos:

- Entregar los diseños de 17 vías pendientes de intervención-, por parte de la Alcaldía.



Vía Victoria Regia

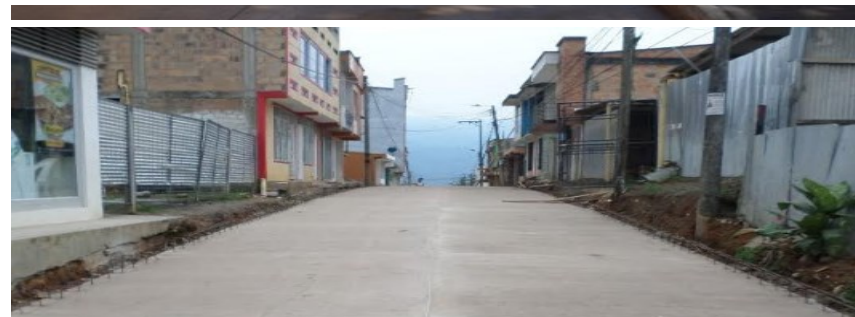

Avance intervención Vía La Brigada



Avance intervención Vía Barrio Obrero

- **Subsidios de Arriendo**
\$10.200 millones

Avance:

- ✓ 1.220 familias beneficiadas con subsidio pago semestre anticipado

- **Kits de Asistencia Alimentaria**
\$503 millones

Avance:

- ✓ Se entrega 1.220 kits de asistencia alimentaria cada mes



MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

- **Restablecimiento provisional estación Junín**

\$ 45.000 millones

Fecha terminación

Marzo 2018.

Avance:

- ✓ 40% de avance físico,
- ✓ Reconstrucción de la sala de control y remplazo e instalación de tableros.

- **Construcción de la nueva subestación “RENACER” (230 kv):**

Fecha terminación

Marzo 2020.

Avance:

- ✓ 7% de avance físico
- ✓ Fue definido el lote para la ubicación de la subestación en la Vereda Los Guadales.



MINISTERIO DE TRANSPORTE

\$16.100 millones

1. Puente sobre la Quebrada San Antonio

- ✓ Fase de estudios y diseños finalizada.
- ✓ **Fecha de inicio de obras:** Febrero 2018
- ✓ **Responsable:** ANI

2. Puente sobre el río Sangoyaco – Av. Colombia

- ✓ Fase de estudios y diseños finalizada.
- ✓ Invias cuenta con \$ 3.000 millones para dar inicio a la obras.
- ✓ Se realizó solicitud de concepto previo al Ministerio de Hacienda para asignación de recursos por \$7.000 millones.
- ✓ **Responsable:** INVIAS

3. Puente sobre el río Sangoyaco – Terminal


- ✓ Se realizó solicitud de concepto previo al Ministerio de Hacienda para asignación de recursos.
- ✓ **Responsable:** INVIAS
- ✓ **Estado:** En trámite

4. Puente sobre el río Mulato

- ✓ Fase de estudios y diseños finalizada.
- ✓ **12%** de avance físico de la obra
- ✓ **Responsable:** INVIAS
- ✓ **Fecha finalización:** 15 de abril de 2018.



Avance Construcción Puente Vehicular Mulato

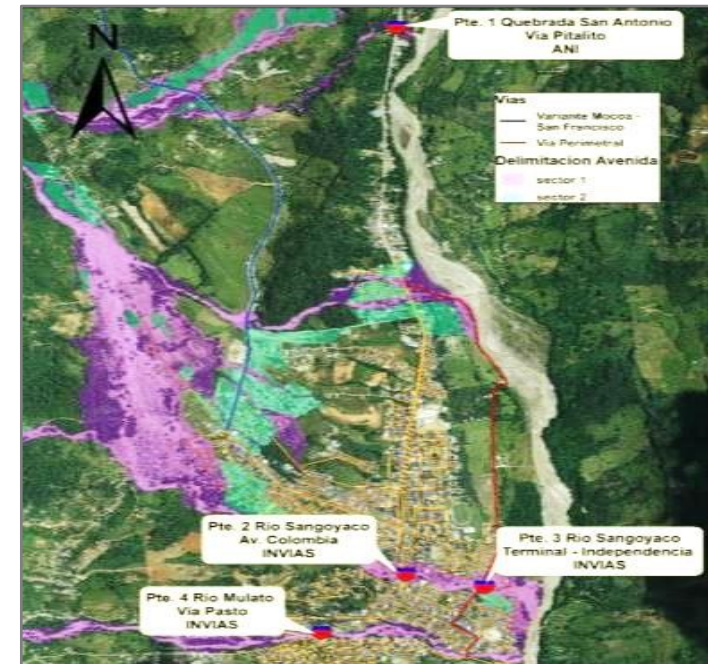

\$5.000 millones

Avance:

- ✓ La Alcaldía realizó priorización de maquinaria amarilla a adquirir, de la siguiente manera:
 - 1 Bulldozer
 - 2 Carrotanques
 - 1 Retroexcavadora
 - 1 Motoniveladora
 - 1 Vibrocompactador
 - 1 Vactor
- ✓ **Estado:** En trámite

Compromisos:

- Asignación de recursos al INVIAS por valor de \$5.000 millones - MinHacienda.



MINISTERIO DE AMBIENTE

- **Estudios y Diseños de Obras de Mitigación**
\$3.000 millones

Fecha de finalización: Mayo 2018

Avance:

- ✓ Se firmó convenio entre MinAmbiente y la UNGRD, para el acompañamiento técnico en el desarrollo de los Estudios y Diseños para las Obras de Mitigación.
- ✓ El día 27 de febrero se dio inicio a la ejecución del convenio

Compromisos:

- Adelantar el proceso de contratación para la elaboración de los Estudios y Diseños (3 de Marzo de 2018)-UNGRD.

- **Construcción de Obras de Mitigación**
\$ 130.000 millones

Avance:

- ✓ Se presentó proyecto al DNP para la definición de la financiación del proyecto.
- ✓ El martes 13 de febrero, se llevó a cabo la Mesa Técnica Ambiental para la revisión de las obras de reducción y mitigación del riesgo:
 1. El encausamiento de las quebradas Taruca y Taruquita.
 2. Recuperación de la ronda hídrica del río Mulato y del río Sangoyaco.



Mesa Técnica Ambiental – 13/02/2018

- **Estudios de Movimiento en Masa y Flujo**

\$1.100 millones

Avance:

- ✓ Con el apoyo del Servicio Geológico Colombiano se entregaron los estudios de amenaza por movimientos en masa y flujo a escala 1:25000, en las cuencas de las quebradas Taruca, San Antonio y el Carmen, y los ríos Sangoyaco y Mulato.
- ✓ Se entregaron los estudios de amenaza por movimientos en masa y flujo a escala 1:5000 para áreas urbanas y suburbanas.

- **Estudios de Microzonificación Sísmica:**

Fecha de finalización: Marzo 2018

Avance:

- ✓ 90% de avance en microzonificación sísmica, exposición y riesgo sísmico para el área urbana y suburbana.



MINISTERIO TIC

\$ 7.100 millones

Avance:

- ✓ Se realizó la entrega de:
 - 3 licencias de emisoras comunitarias.
 - 226 becas en TI- competencias técnico laborales
 - 4.500 computadores para educar
- ✓ Se apoyo en la creación de 318 MiPymes conformadas en TIC.
- ✓ Se instalaron 4 zonas WiFi.
- ✓ Se identificaron 11.591 estudiantes a ser beneficiados de 37 sedes educativas.
- ✓ Se elaboró convocatoria de Mintic e Innpulsa por \$250 millones para acompañar la transformación digital de 200 MiPymes del municipio.



Entrega de Computadores para Educar

Compromisos:

- Instalación de 2 zonas WiFi: Se realizará la entrega en el mes de marzo de 2018.
- Despliegue de televisión digital terrestre: Realizar la entrega de 2.500 decodificadores de TDT en el mes de Marzo de 2018.
- Instalación de punto Vive Digital: Realizar la instalación de un punto en el Instituto Tecnológico del Putumayo en el mes de Junio de 2018.

MINISTERIO DE COMERCIO

\$ 21.138 millones

- **Reactivación de 170 Negocios Formales:**

Avance:

- ✓ \$4.250 millones en inversión para la recuperación de 170 negocios formales.
- ✓ A la fecha 123 negocios se encuentran funcionando con equipos, maquinaria, inventario y acompañamiento.
- ✓ Se encuentra en ejecución la recuperación de 47 negocios.

- **Cofinanciación: Bancoldex - FNG**

Avance:

- ✓ Línea de Crédito Bancoldex: Desembolsos por \$ 18.701 millones desembolsados para beneficiar a 2.801 empresarios a través de 3.189 operaciones.
- ✓ Garantías – FNG: \$12.334 millones en 742 créditos garantizados.



- **Comunidades indígenas:**

Avance:

- ✓ En 2017 se realizó inversión de \$250 Millones para el fortalecimiento productivo y comercial de 5 cabildos.
- ✓ Durante el año 2018 serán invertidos \$200 millones en acompañamiento técnico a las comunidades.

\$ 252 millones

- **Acciones ejecutadas para la promoción del turismo en el Municipio de Mocoa:**

- ✓ Plan promocional del destino a nivel departamental.

Valor inversión: \$70 millones

- ✓ Enlace al proyecto de “Turismo, Paz y Convivencia- Cogestores de Paz”.

Valor inversión: \$36 millones

- ✓ Participación departamental en la versión XXXVII de la Vitrina Turística ANATO 2018.

Valor inversión: \$4 millones

- ✓ Inclusión del Municipio de Mocoa como atractivo turístico en la estrategia de corredores turísticos.

Valor inversión: \$12 millones

- ✓ Programa para la enseñanza del idioma inglés a los prestadores turísticos registrados.

Valor inversión: \$64 millones

- ✓ Consultoría para asistencia técnica a instituciones educativas, para que sean parte de la Red Colegios Amigos del Turismo.

Valor inversión: \$32 millones

- ✓ Programa de capacitación en servicio al cliente a los prestadores turísticos registrados.

Valor inversión: 36 millones

DEPARTAMENTO NACIONAL PLANEACIÓN

\$ 4.886* millones

* Incluye estudios de riesgos

Tiempo de ejecución: 9 meses

Avance:

- ✓ **11 de diciembre de 2017:** Presentación del Enlace Territorial ante el Concejo Municipal y el gabinete de la Alcaldía (Consejo de Gobierno de Mocoa).
- ✓ **19 de diciembre de 2017:** visita a centros nucleados con INYPSA.
- ✓ **5 de enero a la fecha:** equipo de riesgos en campo recolectando información y visitando las principales fuentes hídricas.
- ✓ **11 de enero de 2018:** socialización de la estrategia de participación con la Alcaldía, ASOJUNTAS e INYPSA.
- ✓ **Otras actividades en curso:**
 - Identificación, recolección y clasificación de la información disponible.
 - Análisis de información básica de riesgos.
 - Consecución y adecuación de la sede en Mocoa.
 - Reuniones semanales con la Alcaldía y Corpoamazonia.

**PROGRAMA
POT
MODERNOS**



3. RENDICIÓN DE CUENTAS

VALOR DONACIONES EN EFECTIVO - UNGRD CUENTA DAVIVIENDA NO. 021666888

Donaciones Nacionales	\$ 10.089.155.785
Donaciones Países, Gobiernos y personas en el exterior	\$ 27.255.048.913
TOTAL RECAUDADO	\$ 37.344.204.698

ASIGNACIÓN RECURSOS DONACIONES

Uniformes estudiantes de Mocoa	\$ 718.017.000
Construcción de Megacolegio Sauces II	\$ 8,500,000,000
Adquisición del Predio Sauces I - Vivienda Urbana	\$ 1,907,820,000
Escrituración del Predio Sauces I – Vivienda Urbana	\$ 9,637,000
Estudios, diseños e interventoría Predio Sauces I - Vivienda Urbana	\$ 1,455,032,040
Adquisición del predio Sauces II - Vivienda Urbana	\$ 1,185,665,880
Asistencia Humanitaria de Emergencia (Destinación específica del BID)	\$ 569,200,000
Adecuaciones accesos y servicios públicos predio Plaza de Mercado Definitiva	\$ 1,700,000,000
Adquisición de predio para la Plaza de Mercado Definitiva	\$ 400,000,000
Pavimentación de vías urbanas	\$ 5,000,000,000
Mejoramiento de instalaciones educativas e instalación de equipos Colegio Ciudad Mocoa	\$ 290,000,000
Laboratorio de ciencia y dotación de la banda de paz del Colegio Ciudad Mocoa	\$ 122,793,200
Dotación del Centro de Desarrollo Infantil	\$ 173,366,667
Estudios y diseños para las obras de mitigación	\$ 3,000,000,000
Adquisición Predio– Vivienda Rural	\$ 1,252,773,000
TOTAL ASIGNADO	\$ 26,284,304,787
POR ASIGNAR	\$ 11,059,899,911

TIPO	ELEMENTOS	DONANTE	ESTADO
ASISTENCIA HUMANITARIA DE EMERGENCIA	2,500 toneladas de Asistencia Humanitaria de Emergencia	COMUNIDAD y SECTOR PRIVADO	Distribuido en un 100% a más de 7.000 familias
AGUA Y SANEAMIENTO	329 Tanques agua 500l; 52 Tanques agua 250l; 25 Tanques agua 1000l; 15 Tanques agua 2000l; 126 Canecas 20l	COLEMPAQUES	En proceso de instalación en proyectos de reconstrucción de Mocoa (Vivienda Urbana y Vías).
	3 kits Tanques de almacenamiento de 6.000L	SKINCO GYPLAC	Instalados y utilizados en Alojamientos Temporales
INSUMOS Y ELEMENTOS PARA INSTITUCIONES MÉDICAS	Medicamentos, 200 kits de aseo básico, 100 lámparas solares	GOBIERNO DE TURQUÍA	Entregados a las entidades locales de salud. Coordinado por el Sistema Nacional del Salud
	Elementos Hospitalarios	GLOBAL LINK/ OPS	
ALOJAMIENTOS TEMPORALES	63 Cajas Shelterbox (carpas familiares)	SHELTERBOX	Entregadas a 63 familias en zona rural de Mocoa
ENERGÍA	30 Generadores eléctricos de 60 Hz	GOBIERNO DE JAPÓN	Desplegados en la zona cuando se requirieron y en pre-posicionamiento en el CNL
	1 planta eléctrica	EDUARDOÑO	
LOGÍSTICA	Contenedor nevera para conservación de cadáveres	AMERISUR	
TELECOMUNICACIONES	10 equipos portátiles de comunicación de dos vías Digital	ASECONES	Asignados y en operación en el Sistema de Alerta Temprana de Mocoa
ELEMENTOS AUDIOVISUALES	Mapas e Imágenes de drones de alta precisión	GLOBAL MEDIC	Entrados al SNGRD para toma de decisiones

Asignación Recursos PGN -UNGRD

Fondo Interministerial

Línea de Intervención	Valor
I. RESPUESTA	\$ 7,346,945,825
1. ASISTENCIA HUMANITARIA DE EMERGENCIA	\$ 6,604,445,830
2. APOYO EXEQUIAL	\$ 742,499,995
II. ESTABILIZACIÓN	\$ 30,579,142,012
3. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$ 7,544,121,985
4. TRABAJOS DE MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CAUCES	\$ 5,895,026,962
5. SUBSIDIOS DE ARRIENDO	\$ 10,200,000,000
6. ALBERGUES TEMPORALES	\$ 5,885,510,172
7. MEDIOS DE VIDA	\$ 82,400,000
8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 372,829,504
9. OPERACIÓN Y LOGÍSTICA	\$ 474,020,793
10. INFRAESTRUCTURA DE EMERGENCIA	\$ 125,232,596
III. RECONSTRUCCIÓN	\$ 2,073,912,163
11. SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	\$ 2,073,912,163
TOTAL	\$ 40,000,000,000
