



BALANCE OPERACIÓN MOCOA

EVENTO: AVENIDA TORRENCIAL

Marzo 31 de 2017 /11:24p.m.

MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

Reporte: 12 de Febrero de 2018

1. Balance de Afectación

EVENTO QUE SE PRESENTÓ

Avenida Torrencial ocasionada por el aumento de los niveles de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, en el municipio de Mocoa.

MARCO LEGAL

- Decreto de Desastre para el Municipio de Mocoa No. 599, expedido por el señor Presidente.
- Decreto de Estado Emergencia Económica, Social y Ecológica No. 601, expedido por el señor Presidente.
- Decreto de Calamidad Pública Departamental No. 068 expedido por la Gobernadora
- Decreto de Calamidad Pública Municipal No. 056, expedido por el Alcalde



Puesto de Mando Unificado

PERSONAS

Heridos	398
Fallecidos*	333
Cuerpos Entregados a las Familias	300
Desaparecidos	76
Familias Registradas en el RUD	7.794
Personas Registradas en el RUD	22.310

INFRAESTRUCTURA

Barrios Afectados	48
Subestación Eléctrica	1
Acueductos	2
Red de Gas	1
Kilómetros de Vías	11.58
Puentes Destruídos	2
Puentes Averidos	3
Viviendas Afectadas	1.461
Hectáreas Rurales	486,3

* Fuente: Medicina Legal

2. Fases del Proceso



2.1 RESPUESTA
(18 Días)

2.2 ESTABILIZACIÓN
(90 Días)

**2.3 RECUPERACIÓN -
RECONSTRUCCIÓN**
(3 AÑOS)



ABRIL 2017



JULIO 2017

2017 –2020

**Todo el proceso se adelanta con el acompañamiento de Procuraduría,
Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y Contraloría**

2.1 Fase de Respuesta

ACTIVACIÓN INMEDIATA

Activación del Protocolo de Respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en cabeza del señor Presidente de la República.

PUESTO DE MANDO UNIFICADO

Activación del Puesto de Mando Unificado en menos de 8 horas **120 Reuniones Realizadas**

Miembros del SNGRD que operaron **Más de 2.300**

Personas Atendidas en los Puesto de Información **Más de 10.000**

ASISTENCIA HUMANITARIA

AHE Alimentaria y No Alimentaria (Mercados, Kits de Aseo, Frazadas, Colchonetas, Kits de Cocina) **2.540 Toneladas Entregadas al 100%**

APOYO EXEQUIAL

Apoyos Exequiales entregados **297 Fallecidos**

FASE DE RESPUESTA

100%

EN 18 DÍAS DE OPERACIÓN



SALUD

Dosis de Vacunas Aplicadas (Tétano, Hepatitis A y Varicela) **57.945**

Vacunas Aplicadas Animales **1.639**

ENERGÍA

Energía habilitada el día 11 con una subestación provisional **100%**

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Restablecimiento de Telefonía y datos **100%**



Asistencia Humanitaria de Emergencia

AGUA Y SANEAMIENTO

Litros de Agua Entregados

Más de 88 millones

Litros de Agua Entregados por Día

1 millón

Se utilizaron más de **40 Carrotanques** en la operación, Plantas Potabilizadoras, Motobombas y Tanques de Almacenamiento.

Hoy 3 Carrotanques se encuentran disponibles

ALBERGUES TEMPORALES

Personas que estuvieron en los Albergues

4.561

Albergues que fueron Habilitados y Administrados

9

SUBSIDIOS DE ARRIENDO

Subsidios de Arriendo Entregados

4.448

Valor Subsidios: \$10.200 millones
Hasta junio de 2018

FASE DE ESTABILIZACIÓN

100%

90 días



TRANSPORTE Y TRASLADOS

Personas que fueron trasladadas a otras ciudades con el apoyo de Cancillería y OIM

765

MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO

Equipos de Maquinaria Amarilla que fueron utilizados en la operación **208**

Se utilizaron 51.642 Horas Máquina para la rehabilitación de vías, remoción de escombros, limpieza de calles y colegios, dragados y re conformación de cauce de los ríos y quebradas.

INFRAESTRUCTURA

Puentes Vehiculares habilitados (1 Puente Militar) **4**

Vías Nacionales Habilitadas **3**

AGUA

Bocatomas Rehabilitadas **4**

Zona con Disponibilidad de Agua Potable terminada (Suroccidente) **1**

Zonas con Disponibilidad de Agua Cruda (Centro, Barrios Unidos y Norte) **3**

Suministro de materiales-UNGRD, Soporte Técnico-MinVivienda, Logística- Ejercito Nacional

EDUCACIÓN

Sedes Educativas Habilitadas **57**

Aulas Móviles Instaladas **8**

Kits Escolares Entregados **14 mil**

COMERCIO

Comerciantes Caracterizados **354**

Exención del IVA



Planta Potabilizadora de Agua

CULTURA

Libros y lámparas entregadas a niños **2.056**

Jornadas Socioculturales **61**

AMBIENTE

Elaboración del Mapa de Zonificación de Riesgo (Mesa Técnica de Ambiente) **1**

EMPLEO Y CAPACITACIÓN

Empleos Generados: (Remoción de Escombros, Manejo de Maquinaria) **270**

NIÑEZ

Suplemento Alimenticio para Niños y Madres Gestantes **47 Toneladas entregadas**

CONTINUAMOS EN ...

- Subsidio de Arriendo y Asistencia Humanitaria para propietarios de vivienda destruida.

OPERACIÓN DE LA OFICINA DEL GOBIERNO NACIONAL PERMANENTE EN MOCOA - OGN



Seguimiento con Sectores en OGN

2.3. Fase de Reconstrucción

\$ 1,2 billones

Periodo: 2017-2022

Departamento Nacional de Planeación

✓ Comprende 122 acciones en 6 líneas de acción estratégicas:

- Ordenamiento Territorial, Ambiente y Gestión del Riesgo.
- Infraestructura Social.
- Conectividad e Integración Regional.
- Desarrollo Económico.
- Desarrollo Social.
- Desarrollo Institucional.

PLAN PARA LA
RECONSTRUCCIÓN
DE
MOCOA
2017 - 2022

Documento
CONPES

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

3904

SECTOR
VIVIENDA



1.461

Total Viviendas a Construir

1.209 Viviendas Urbanas

252 Viviendas Rurales



Vivienda Urbana

Avance:

- ✓ **100%** de avance en la etapa de estudios y diseños.
- ✓ Cronograma de entrega de viviendas:

Mes-2018	N° Viviendas
Febrero	100
Marzo	40
Abril	64
Mayo	96
Total	300

Compromisos:

- Instalación de redes de urbanismo en el mes de febrero de 2018.

Ministerio de Vivienda

Fase 1: Construcción de 300 viviendas (Los Sauces I)

\$ 22.260 millones



Seguimiento Construcción Fase I Vivienda Urbana – Los Sauces I

Tiempo de ejecución:

1 año
(Mayo 2017- Mayo 2018)

Vivienda Urbana

Fase 2: Construcción de 909 viviendas (Los Sauces II)

\$60.448 millones

Avance:

- ✓ Adquisición del predio Sauces II de 16.93 Hectáreas, por expropiación.
- ✓ Asignación de recursos para la ejecución de la Fase II por FONVIVIENDA.
- ✓ Se seleccionó el contratista para la construcción de 528 viviendas.
- ✓ En proceso de contratación de la interventoría.

Compromisos:

- Se adelanta proceso de contratación para estudios, diseños, obra e interventoría de las 381 viviendas restantes.



Predio - Sauces II

Tiempo de ejecución:

1 año y 4 meses
(Febrero 2018- Junio 2019)

Construcción del Sistema de Acueducto

Viceministerio de Agua

\$28.074 millones

Avance:

- ✓ 5.7% de avance físico en estudios, diseños y obra.
- ✓ 45% de avance físico en la instalación de redes de acueducto.
- ✓ 6.200 metros lineales instalados de redes de acueducto.
- ✓ En proceso de concertación del Resguardo Indígena INGA.

Compromisos:

- Proceso de acopio de materiales e inicio de obras de la bocatoma. (1° semana de Febrero).



Avance instalación de redes de acueducto

Tiempo de ejecución: 8 meses

Plan Maestro de Alcantarillado

Viceministerio de Agua

\$91.200 millones

Avance:

- ✓ Se remitió minuta al BID para suscribir el contrato de préstamo, y se programa la firma para el 15 de febrero de 2018.

Ministerio de Vivienda

\$ 4.473 millones

Avance:

- ✓ 2% de avance físico de la obra.
- ✓ Se definió que los recursos donados por la organización “Give To Colombia” por valor de \$173 millones, serán destinados para la dotación del CDI.

Compromisos:

- En proceso de adquisición la dotación del CDI - UNGRD

Fecha de Finalización Julio de 2018



SECTOR
AGRICULTURA

Vivienda Rural

Construcción de 252 viviendas

\$13.467 millones

Avance:

- ✓ Suscripción del convenio entre el Banco Agrario y la UNGRD.
- ✓ Validación de 252 familias por parte del Banco Agrario.
- ✓ Se realizó el Desembolso de los recursos por parte del Banco Agrario a la UNGRD.
- ✓ La Alcaldía definió un nuevo predio, ubicado en la vereda Las Planadas , para el desarrollo del proyecto

Compromisos:

- La UNGRD adelanta el avalúo con el IGAC del nuevo predio para realiza el proceso de adquisición.

Tiempo de ejecución: 1 año y 5 meses

Mejoramiento de 350 viviendas Rurales MinAgricultura

\$6.220 millones

Avance:

- ✓ La Alcaldía remitió listado con potenciales familias a ser beneficiadas.

Compromisos:

- Presentar el proyecto en la próxima comisión de vivienda para definir la disponibilidad de recursos para la vigencia 2018 de acuerdo a los “Programas Estratégicos Bolsa Nacional – Agencia Nacional de Desarrollo Rural”.- MinAgricultura.

Avance:

- ✓ Se suscribió convenio entre el FNGRD, MinAgricultura y la Alcaldía.
- ✓ El Ministerio de Agricultura realizó el desembolso de los recursos al FNGRD.
- ✓ Componentes del proyectos:
 - Avicultura.
 - Cítricos.
 - Plátano.
 - Aguacate.
 - Asistencia Técnica.
 - Suministro de Herramientas y Equipos.

Compromisos:

- Se adelanta el proceso de contratación para el suministro de elementos agrícolas y el personal de asistencia técnica– UNGRD.

Tiempo de ejecución 6 meses

SECTOR

PROSPERIDAD SOCIAL

Mejoramiento de 300 viviendas Urbanas Prosperidad Social

\$4.972 millones

Avance:

- ✓ Convenio suscrito con el operador UNOPS.
- ✓ Se definieron 3 etapas del proyecto:
 - **1era Etapa:** 120 viviendas.
Duración: 3,5 meses (Febrero – Mayo 2018)
 - **2da Etapa:** 100 viviendas.
Se presenta el proyecto al comité de estructuración el 20 de febrero.
Duración: 3 meses (Marzo-Mayo 2018).
 - **3ra Etapa:** 80 viviendas. Duración: 2,5 meses.

Compromisos:

- Expedición de certificaciones de condiciones de habitabilidad por parte de la Alcaldía.

Prosperidad Social
\$8.100 millones

Avance:

- ✓ Se adquirió el predio Santa Mónica de 2 hectáreas, por proceso de expropiación.
- ✓ Se suscribió convenio entre Prosperidad Social y la UNGRD para la construcción.

Compromisos:

- Entrega de insumo técnico por parte de Prosperidad Social, para adelantar la contratación derivada.
- Con este insumo, la UNGRD adelanta el proceso contractual de los estudios, diseños y ejecución de la obra (Plaza de mercado, vías de acceso y adecuación de servicios públicos).
- Revisar la infraestructura para instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales- Prosperidad Social y UNGRD.



Predio Santa Mónica

Tiempo de ejecución: 2 años y 5 meses
(Diciembre 2017 a Marzo de 2020)

SECTOR
EDUCACIÓN

- **Construcción del Mega Colegio ubicado en el predio Sauces II. \$ 8.500 millones** **Ministerio de Educación**

Avance:

- ✓ Se suscribió convenio entre UNGRD y MinEducación.
- ✓ Fecha de inicio de obras: Agosto 2018.
- ✓ Fecha de finalización: Mayo de 2019.

Compromisos:

- Adelantar el proceso de contratación de la consultoría de diseños, obra e interventoría, una vez se cuente con la Licencia de Urbanismo – UNGRD (Abril de 2018).

- **Construcción de 24 Aulas en 3 Instituciones Educativas** **\$ 8.500 millones**

Avance:

- ✓ Se suscribió convenio con Findeter.
- ✓ Fecha de inicio de obras: Marzo de 2018.
- ✓ Fecha de finalización: Marzo de 2019.

- **Mejoramiento de 9 Sedes Educativas** **\$ 2.897 millones**

Avance:

- ✓ Se suscribió convenio con Findeter .
- ✓ Fecha de inicio de obras: Junio de 2018.
- ✓ Fecha de finalización: Septiembre de 2018.

- **Construcción del colegio Fray Placido por la Gobernación del Putumayo. \$ 8.500 millones**
- **Mejoramiento de la sede CAMENTSA por parte de la Gobernación.**

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
\$413 millones

Avance:

- ✓ 56% de avance físico en la adecuación de la cubierta y acceso peatonal al colegio, con los recursos donados por Caracol TV (Yo me llamo).

Compromisos:

- Se adelanta el proceso de contratación para la adecuación del laboratorio de ciencias naturales y de la banda de paz, con los recursos donados por “Caring For Colombia” por valor de \$123 millones. UNGRD (Febrero de 2018).

Tiempo de ejecución: 3 meses
(Enero-Marzo 2018)



Avance adecuación del Colegio Ciudad Mocoa

Avance:

- ✓ Se realizó la entrega de la totalidad de los uniformes para 2.518 estudiantes.
- ✓ Cumplido 100%.



Entrega de Uniformes Escolares

SECTOR
CULTURA

Ministerio de Cultura- Embajada de Japón

\$347 millones

Avance:

- ✓ 100% de avance físico en la adecuación y cerramiento de terrenos.
- ✓ 70% de avance físico en la construcción.

Compromisos:

- Dar inicio a las obras de enchape de pisos, instalación de baterías de baño y colocación de cubierta.

Fecha de Finalización: Marzo de 2018



SECTOR
CANCILLERÍA

Construcción Casa Lúdica Los Sauces I

\$ 800 millones

Avance:

- ✓ Se adelantaron los estudios y diseños.
- ✓ Se realizó la socialización con la comunidad y las autoridades locales el día 28 de noviembre de 2017.

Tiempo de Ejecución

4.5 meses (marzo-julio 2018)

Construcción de Cancha Deportiva Los Sauces I \$ 99 millones

Avance:

- ✓ Se suscribió convenio suscrito entre la UNGRD, FUPAD y la Cancillería.

Compromisos:

- En trámite expedición de la licencia de construcción por la Alcaldía.

Tiempo de ejecución 4 meses (marzo-junio 2018)

SECTOR

GESTIÓN DEL RIESGO

Instalación del SAT

\$1.223 millones

Avance:

- ✓ 100% de avance en la implementación del SAT.
- ✓ 1 puesto de monitoreo instalado
- ✓ 11 sensores de río colocados
- ✓ 4 estaciones meteorológicas instaladas
- ✓ 12 sirenas instaladas

Estudios y diseños SAT

\$600 millones

Avance:

- ✓ 100% de avance en el estudio realizado con el apoyo de la Universidad Javeriana.

SAT Comunitario

\$205 millones

Avance:

- ✓ 100% en la implementación del SAT comunitario.
- ✓ 27.800 habitantes a ser beneficiados



Sirenas instaladas



Simulacro de evacuación realizado

Rehabilitación Cancha Deportiva El Pepino

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

\$360 millones

Avance:

- ✓ **100%** de avance físico del proceso de rehabilitación.
- ✓ 3.700 personas a ser beneficiadas

Tiempo de ejecución:

3 meses
(Septiembre 2017 a Diciembre 2017)



Cancha Deportiva el Pepino

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

\$351 millones

Avance:

- ✓ 60 medios de vida entregados al 100%, para que las familias se reactiven económicamente y activen sus medios de subsistencia.



Construcción de 4 Puentes Peatonales

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

\$ 348 millones

Avance:

- ✓ **Puente Mulato:** 100% terminado.
- ✓ **Puente Villa Rosa – San Miguel:** 100% terminado.
- ✓ **Puente Dantayaco:** 100% terminado.
- ✓ **Puente San Agustín:** En proceso de construcción

Fecha de entrega del Punto: 30 de Marzo 2018.



Puente Dantayaco



Puente Mulato



Puente Villa Rosa – San Miguel

Avance:

- ✓ **286** metros lineales de vías pavimentadas de 2.800 metros proyectados.

Vías Pavimentadas:

- **Victoria Regia:** Intervención de 110 ml.
Avance físico pavimentación: **100%**.
- **Pablo VI:** Intervención de 126 ml.
Avance físico pavimentación: **100%**.
- **La Brigada:** Intervención de 190 ml.
Avance físico obras preliminares: **22%**.

Compromisos:

- Entregar diseños de 17 vías pendientes de intervención- Alcaldía.

Tiempo de ejecución: 18 meses
(Octubre 2017 - Marzo 2019)



Subsidios de Arriendo

\$10.200 millones

Avance:

- ✓ 8.384 subsidios entregados en tres prorrogas para 1.200 familias.

A partir de Enero de 2017, se realizaran las prorrogas cada 6 meses.

Asistencia Humanitaria

\$503 millones

Avance:

- ✓ 5.215 kits de asistencia humanitaria entregados desde Octubre 2017 a Enero 2018.

Se realiza la entrega la primera semana de cada mes.



Entrega de Asistencia Humanitaria-Enero de 2018

SECTOR
TELECOMUNICACIONES

MINTIC

\$ 7.100 millones

Avance:

- ✓ Se realizó la entrega de:
 - 3 licencias de emisoras comunitarias.
 - 226 becas en TI- competencias técnico laborales
 - 4.500 computadores para educar
- ✓ Se apoyo en la creación de 318 MiPymes conformadas en TIC.
- ✓ Se instalaron 4 zonas WIFI.
- ✓ Se identificaron 11.591 estudiantes a ser beneficiados de 37 sedes educativas.
- ✓ Se elaboró convocatoria de Mintic e Innpulsa por \$250 millones para acompañar la transformación digital de 200 MiPymes del municipio.
- ✓ Se realizó transferencia de metodología a la Cámara de Comercio.



Compromisos:

- Instalación de 2 zonas WIFI: Se realizará la entrega en el mes de marzo de 2018.
- Despliegue de televisión digital terrestre: Realizar la entrega de 2.500 decodificadores de TDT. **Plazo:** Febrero de 2018.
- Instalación de punto Vive Digital: Realizar la instalación de un punto en el Instituto Tecnológico del Putumayo. **Plazo:** Junio de 2018.

SECTOR
COMERCIO

Reactivación de 170 Negocios Formales:

Avance:

- ✓ \$3.000 Millones en ejecución para 120 Negocios iniciales. A la fecha solo faltan 20 negocios por terminar entrega de apoyos en equipos, maquinarias e inventario.
- ✓ Está en proceso de contratación un cuarto proyecto para reactivación de 50 negocios adicionales.

Tiempo de ejecución:

Primera Fase: 6 meses (Julio 2017 a febrero de 2018)

Segunda Fase: 6 meses (Noviembre 2017 a junio de 2018)

Cofinanciación: Bancoldex - FNG

Avance:

- ✓ Línea de Crédito Bancoldex: Desembolsos por \$ 16.638 Millones a intermediarios financieros, representados en 3.188 operaciones y más de 3.060 beneficiarios.
- ✓ Garantías – FNG: \$11.003 millones en 581 créditos garantizados.

Ministerio de Comercio

\$ 21.138 millones



Comunidades indígenas:

Avance:

- ✓ En ejecución: Fortalecimiento productivo y comercial de 5 cabildos. Inversión \$250 Millones.
- ✓ Encuentro regional de Economías Propias MCOCA – Feria de Negocios del 09 al 11 de Nov/17.
- ✓ Comunidad Simuyaco - \$ 20 millones
- ✓ Turismo: Ingresos confirmados por valor de \$60 millones, beneficiando a 150 personas.

Competitividad Sector Turismo

Convocatoria Nacional para Planes de Negocio de Turismo Comunitario:

- ✓ Se ejecutaran los siguientes proyectos a través de FONTUR:
 - **Puerto Caicedo:** “Diseño de producto turístico en naturaleza y cultura de la comunidad indígena Awa”.
 - **Mocoa:** “Plan de comercialización para la puesta de mercadeo turismo de naturaleza, con énfasis en turismo de aventura y turismo científico para el diseño de producto turístico en el eje ambiental Mocoa – Villagarzón”.

Capacitación y Formalización para Prestadores de Servicios Turísticos:

- ✓ Dos formadores nativos continúan impartiendo capacitaciones en bilingüismo a los prestadores turísticos registrados.
- ✓ Se han realizado 2 talleres de “Implementación del Diseño de Producto Turístico” tanto en Mocoa como en Valle del Sibundoy.
- ✓ Definición de participación de la líder de la base empresarial de Putumayo y un prestador turístico en el “Evento Colombia Empresarial 2025”.

Promoción del Destino a Nivel Departamental:

- ✓ Se dispone de recursos por valor de **\$350 millones** para promoción del destino a nivel departamental a través del proyecto ‘Destinos Turísticos en Emergencia’.

SECTOR
SALUD

Construcción y Dotación Hospital José María Hernández

Ministerio de Salud-Gobernación del Putumayo
\$33.826 millones

Avance:

✓ **33,76%** de avance físico en la obra.

Fecha de Finalización:

Marzo de 2020



Compromisos:

- Definir los proyectos biomédicos a desarrollarse por el Ministerio de Salud.

SECTOR
ENERGIA

Restablecimiento provisional estación Junín

Avance:

- ✓ 30% de avance físico, representado en limpieza de equipos, reconstrucción de la sala de control y remplazo e instalación de tableros.
Fecha terminación: Mayo de 2018

Construcción de la nueva subestación “RENACER”:

Avance:

- ✓ 5% de avance físico
En proceso etapa de prediseño.
Fecha de terminación: Marzo de 2020.

Compromiso:

- ✓ Revisar que el lote para la construcción este fuera de la mancha.

Ministerio de Minas y Energía

\$ 45.000 millones



Subsidios al Consumo de Energía Eléctrica \$462 millones

Avance:

- ✓ Se otorgará por un periodo de 6 meses subsidios a los damnificados de estratos 1, 2 y 3 registrados en el RUD y que figuren como usuarios de la Empresa de Energía de Putumayo (Según Resolución N° 41530 de Dic. de 2017)

SECTOR
AMBIENTE

Estudios de Movimiento en Masa y Flujo

\$1.100 millones

Avance:

- ✓ Se entregaron los estudios de amenaza por movimientos en masa y flujo a escala 1:25000, en las cuencas de las quebradas Taruca, San Antonio y el Carmen, y los ríos Sangoyaco y Mulato.
- ✓ Se entregaron los estudios de amenaza por movimientos en masa y flujo a escala 1:5000 para áreas urbanas y suburbanas.

Estudios de Microzonificación Sísmica:

Avance:

- ✓ 80% de avance en microzonificación sísmica, exposición y riesgo sísmico para el área urbana y suburbana.



Estudios y Diseños Obras de Mitigación

\$3.000 millones

Avance:

- ✓ Se firmó convenio entre MinAmbiente y la UNGRD, para el acompañamiento técnico en el desarrollo de los Estudios y Diseños para las Obras de Mitigación (Última Semana de Enero).

Compromisos:

- Adelantar el proceso de contratación para la elaboración de los Estudios y Diseños (3 de Marzo de 2018)- UNGRD.

Construcción de Obras de Mitigación

\$ 130.000 millones

Avance:

- ✓ Se presentó proyecto al DNP para la definición de la financiación del proyecto.
- ✓ Durante la semana del 15 al 18 de enero el Ministro de Ambiente realizó visita a las zonas afectadas en Mocoa para evaluar y verificar necesidades.



SECTOR
INFRAESTRUCTURA VÍAL

\$9.700 millones

1. Puente sobre la Quebrada San Antonio

- ✓ Fase de estudios y diseños finalizada.
- ✓ **Fecha de inicio de obras:** Febrero 2018
- ✓ **Responsable:** ANI

2. Puente sobre el rio Mulato


- ✓ Fase de estudios y diseños finalizada.
- ✓ **40%** avance construcción estructura en el taller
- ✓ **1,3%** de avance físico de la obra
- ✓ **Responsable:** INVIAS
- ✓ **Fecha finalización:** 15 de abril de 2018.

3. Puente sobre el rio Sangoyaco – Terminal

- ✓ Se realizó solicitud de concepto previo al Ministerio de Hacienda para asignación de recursos.
- ✓ **Responsable:** INVIAS
- ✓ **Estado:** Sin Recursos

2. Puente sobre el rio Sangoyaco – Av. Colombia

- ✓ Fase de estudios y diseños finalizada.
- ✓ **Responsable:** INVIAS
- ✓ **Fecha inicio de obras:** 19 de Febrero de 2018.

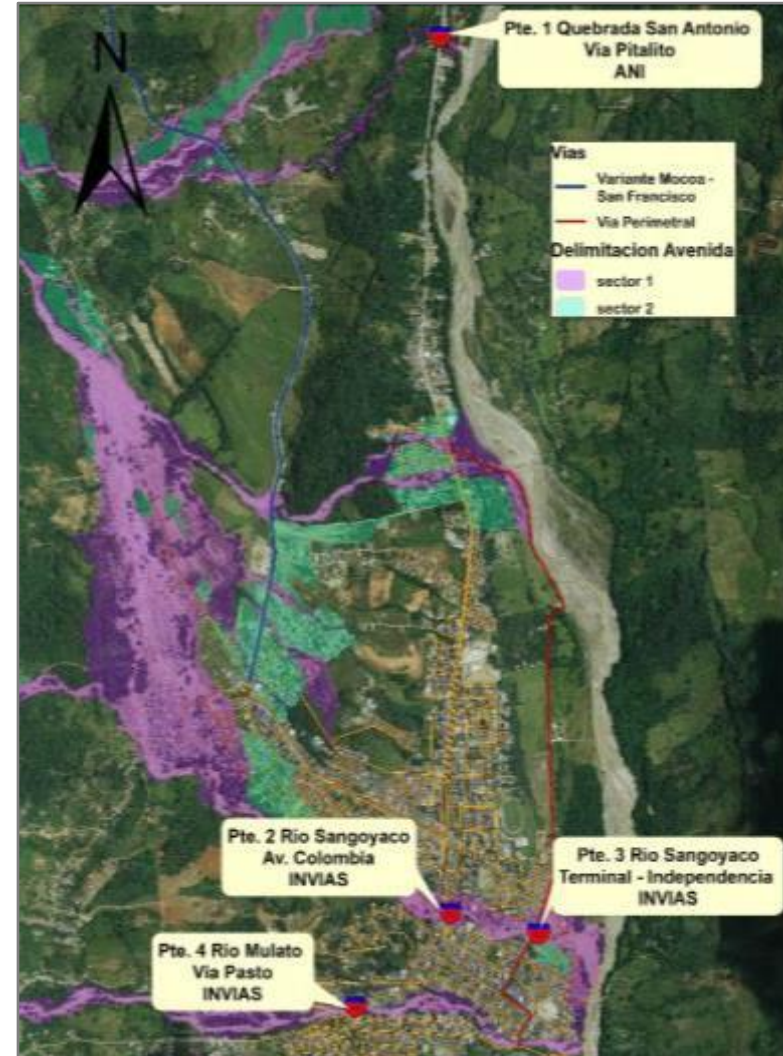

INVIAS

\$5.000 millones

Avance:

- ✓ La Alcaldía realizó priorización de maquinaria amarilla a adquirir, de la siguiente manera:
 - 1 Bulldozer
 - 2 Carrotanques
 - 1 Retroexcavadora
 - 1 Motoniveladora
 - 1 Vibrocompactador
 - 1 Vactor
- ✓ Se realizó la proyección de equipos a adquirir con recursos del FNGRD- UNGRD.
- ✓ **Estado: Sin Recursos**

Compromisos:

- Asignación de recursos al INVIAS por valor de \$4.000 millones - MinHacienda.



3. REDICIÓN DE CUENTAS

VALOR DONACIONES EN EFECTIVO - UNGRD CUENTA DAVIVIENDA NO. 021666888

Donaciones Nacionales	\$ 10.089.155.785
Donaciones Países, Gobiernos y personas en el exterior	\$ 27.255.048.913
TOTAL RECAUDADO	\$ 37.344.204.698

ASIGNACIÓN RECURSOS DONACIONES

Uniformes estudiantes de Mocoa	\$ 718.017.000
Construcción Colegio de 24 aulas en Sauces II	\$ 8,500,000,000
Adquisición del Predio Sauces I - Vivienda Urbana	\$ 1,907,820,000
Escrituración del Predio Sauces I – Vivienda Urbana	\$ 9,637,000
Estudios, diseños e interventoría Predio Sauces I - Vivienda Urbana	\$ 1,455,032,040
Adquisición del predio Sauces II - Vivienda Urbana	\$ 1,185,665,880
Asistencia Humanitaria de Emergencia	\$ 569,200,000
Adecuaciones accesos y servicios públicos predio Plaza de Mercado Definitiva	\$ 1,700,000,000
Adquisición de predio para la Plaza de Mercado Definitiva	\$ 400,000,000
Pavimentación de vías urbanas	\$ 5,000,000,000
Mejoramiento de instalaciones educativas e instalación de equipos Colegio Ciudad Mocoa	\$ 290,000,000
Laboratorio de ciencia y dotación de la banda de paz del Colegio Ciudad Mocoa	\$ 122,793,200
Dotación del Centro de Desarrollo Infantil	\$ 173,366,667
Estudios y diseños para las obras de mitigación	\$ 3,000,000,000
Adquisición Predio– Vivienda Rural	\$ 1,252,773,000
TOTAL ASIGNADO	\$ 26,284,304,787
POR ASIGNAR	\$ 11,059,899,911

TIPO	ELEMENTOS	DONANTE	ESTADO
ASISTENCIA HUMANITARIA DE EMERGENCIA	2,500 toneladas de Asistencia Humanitaria de Emergencia	COMUNIDAD y SECTOR PRIVADO	Distribuido en un 100% a más de 7.000 familias
AGUA Y SANEAMIENTO	329 Tanques agua 500l; 52 Tanques agua 250l; 25 Tanques agua 1000l; 15 Tanques agua 2000l; 126 Canecas 20l	COLEMPAQUES	En proceso de instalación en proyectos de reconstrucción de Mocoa (Vivienda Urbana y Vías).
	3 kits Tanques de almacenamiento de 6.000L	SKINCO GYPLAC	Instalados y utilizados en Alojamientos Temporales
INSUMOS Y ELEMENTOS PARA INSTITUCIONES MÉDICAS	Medicamentos, 200 kits de aseo básico, 100 lámparas solares	GOBIERNO DE TURQUÍA	Entregados a las entidades locales de salud
	Elementos Hospitalarios	GLOBAL LINK/ OPS	
ALOJAMIENTOS TEMPORALES	63 Cajas Shelterbox (carpas familiares)	SHELTERBOX	Entregadas a 63 familias en zona rural de Mocoa
ENERGÍA	30 Generadores eléctricos de 60 Hz	GOBIERNO DE JAPÓN	Desplegados en la zona cuando se requirieron y pre-posicionados en el CNL
	1 planta eléctrica	EDUARDOÑO	
LOGÍSTICA	Contenedor nevera para conservación de cadáveres	AMERISUR	
TELECOMUNICACIONES	10 equipos portátiles de comunicación de dos vías Digital	ASECONES	Asignados y en operación en el Sistema de Alerta Temprana de Mocoa
ELEMENTOS AUDIOVISUALES	Mapas e Imágenes de drones de alta precisión	GLOBAL MEDIC	Entrados al SNGRD para toma de decisiones

Asignación Recursos PGN -UNGRD

Fondo Interministerial

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	VALOR
I. RESPUESTA	\$ 7,346,945,825
1. ASISTENCIA HUMANITARIA DE EMERGENCIA	\$ 6,604,445,830
2. APOYO EXEQUIAL	\$ 742,499,995
II. ESTABILIZACIÓN	\$ 30,579,142,012
3. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	\$ 7,544,121,985
4. MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO	\$ 5,895,026,962
5. SUBSIDIOS DE ARRIENDO	\$ 10,200,000,000
6. ALBERGUES TEMPORALES	\$ 5,885,510,172
7. MEDIOS DE VIDA	\$ 82,400,000
8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 372,829,504
9. OPERACIÓN Y LOGÍSTICA	\$ 474,020,793
10. INFRAESTRUCTURA DE EMERGENCIA	\$ 125,232,596
III. RECONSTRUCCIÓN	\$ 2,073,912,163
11.1 SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	\$ 2,073,912,163
TOTAL INVERSIÓN RECURSOS	\$ 40,000,000,000

4. Avance del Plan de Acción «Primer Año Mocoa»

PROYECTO	SECTOR	VALOR	
		Cifras en Millones de Pesos	FECHA
Entrega de las primera 100 de 300 viviendas urbanas de la Fase I	Ministerio de Vivienda	\$ 22,260	30 de marzo 2018
Construcción de Biblioteca	Ministerio de Cultura	\$ 347	30 de marzo 2018
Adecuación del Colegio Ciudad Mocoa	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	\$ 413	30 de marzo 2018
Sistema de Alerta Temprana (Simulacro para la entrega)	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	\$ 2,028	30 de marzo 2018
Rehabilitación Cancha Deportiva El Pepino	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	\$ 360	30 de marzo 2018
Puentes Peatonales - Puente Villa Rosa – San Miguel - Puente Dantayaco	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	\$ 348	30 de diciembre 2018
Pavimentación de 2.8 Kms de vías (Puesta en funcionamiento de 1 vía)	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	\$ 5,000	30 de diciembre 2018
Entega de Asistencia Humanitaria	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	\$ 503	30 de diciembre 2018
2 zonas de WiFi	MinTIC		30 de marzo 2018
2500 decodificadores TDT	MinTIC		30 de marzo 2018
226 becas condonables (Evaluación de los becados)	Ministerio de Educacución		30 de marzo 2018
«Estrategia de Comunicaciones Regional para el avance de todos los proyectos» (Vallas publicitarias y medios de comunicación)			
