

AVANCE PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO

RECONSTRUCCIÓN MOCOCHA

25 DE ENERO DE 2018



MINDEFENSA



EVENTO QUE SE PRESENTÓ

Avenida Torrencial ocasionada por el aumento de los niveles de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, en el municipio de Mocoa.

MARCO LEGAL

- Decreto de Desastre para el Municipio de Mocoa No. 599, expedido por el señor Presidente.
- Decreto de Estado Emergencia Económica, Social y Ecológica No. 601, expedido por el señor Presidente.
- Decreto de Calamidad Pública Departamental No. 068 expedido por la Gobernadora
- Decreto de Calamidad Pública Municipal No. 056, expedido por el Alcalde



PERSONAS

Heridos	398
Fallecidos*	333
Cuerpos Entregados a las Familias	300
Desaparecidos	76
Familias Registradas en el RUD	7.794
Personas Registradas en el RUD	22.310

INFRAESTRUCTURA

Barrios Afectados	48
Subestación Eléctrica	1
Acueductos	2
Red de Gas	1
Kilómetros de Vías	11.58
Puentes Destruídos	2
Puentes Averíados	3
Viviendas Afectadas	1.461
Hectáreas Rurales	486,3

ACTIVACIÓN INMEDIATA

Activación del Protocolo de Respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en cabeza del señor Presidente de la República.

PUESTO DE MANDO UNIFICADO

Activación del Puesto de Mando Unificado en menos de 8 horas

120 Reuniones Realizadas

Miembros del SNGRD que operaron

Más de 2.300

Personas Atendidas en los Puesto de Información

Más de 10.000

ASISTENCIA HUMANITARIA

AHE Alimentaria y No Alimentaria (Mercados, Kits de Aseo, Frazadas, Colchonetas, Kits de Cocina) Incluidas las Donaciones de la Primera Dama, Empresas Privadas y Comunidad

2.540 Toneladas Entregadas

APOYO EXEQUIAL

Apoyos Exequiales entregados

297 Fallecidos

FASE DE RESPUESTA

100%

EN 18 DÍAS DE OPERACIÓN



SALUD

Dosis de Vacunas Aplicadas (Tétano, Hepatitis A y Varicela)

57.945

Vacunas Aplicadas Animales

1.639

ENERGÍA

Energía habilitada el día 11 con una subestación provisional

100%

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Restablecimiento de Telefonía y datos

100%



Asistencia Humanitaria de Emergencia

AGUA Y SANEAMIENTO

Litros de Agua Entregados

Más de 88 millones

Litros de Agua Entregados por Día

1 millón

Se utilizaron más de **40 Carrotanques** en la operación, Plantas Potabilizadoras, Motobombas y Tanques de Almacenamiento.

Hoy 3 Carrotanques se encuentran disponibles

ALBERGUES TEMPORALES

Personas que estuvieron en los Albergues

4.561

Albergues que fueron Habilitados y Administrados

9

SUBSIDIOS DE ARRIENDO

Subsidios de Arriendo Entregados

4.448

Valor Subsidios: \$10.200 millones
Hasta junio de 2018

FASE DE ESTABILIZACIÓN

100%

90 días



Transporte y traslados

Personas que fueron trasladadas a otras ciudades con el apoyo de Cancillería y OIM

765

MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO

Equipos de Maquinaria Amarilla que fueron utilizados en la operación **208**

Se utilizaron 51.642 Horas Máquina para la rehabilitación de vías, remoción de escombros, limpieza de calles y colegios, dragados y reconfiguración de cauce de los ríos y quebradas.

INFRAESTRUCTURA

Puentes Vehiculares habilitados (1 Puente Militar) **4**

Vías Nacionales Habilitadas **3**

AGUA

Bocatomas en Rehabilitación **4**

Zona con Disponibilidad de Agua Potable terminada (Suroccidente) **1**

Zonas con Disponibilidad de Agua Cruda (Centro, Barrios Unidos y Norte) **3**

Suministro de materiales-UNGRD, Soporte Técnico-
MinVivienda, Logística- Ejército Nacional

COMERCIO

Comerciantes Caracterizados **354**

Exención del IVA

EDUCACIÓN

Sedes Educativas Habilitadas **57**

Aulas Móviles Instaladas **8**

Kits Escolares Entregados **14 mil**



CULTURA

Libros y lámparas entregadas a niños **2.056**

Jornadas Socioculturales **61**

AMBIENTE

Elaboración del Mapa de Zonificación
de Riesgo (Mesa Técnica de Ambiente) **1**

EMPLEO Y CAPACITACIÓN

Empleos Generados: (Remoción de
Escombros, Manejo de Maquinaria,) **270**

NIÑEZ

Suplemento Alimenticio para Niños y
Madres Gestantes **47
Toneladas
entregadas**

CONTINUAMOS EN ...

- Subsidio de Arriendo para propietarios de vivienda destruida.
- Suministro de Agua en Carrotanques.
- Fortalecimiento Institucional del Consejo Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.

**INSTALACIÓN DE LA
OFICINA DEL
GOBIERNO NACIONAL
PERMANENTE EN
MOCOA - OGN**

Valor Donaciones en Efectivo - UNGRD

Cuenta Davivienda No. **021666888**

Donaciones Nacionales	\$ 10.089.155.785
Donaciones Países, Gobiernos y personas en el exterior	\$ 27.239.109.617
TOTAL	\$ 37.328.265.402

CHINA	\$ 2.854.900.000
EMIRATOS ARABES	\$ 19.690.929.675
TURQUÍA	\$ 430.250.000
BANCO CENTROAMERICANO	\$ 718.375.000
BID	\$ 569.200.000
CAF	\$ 285.765.000
KEYCOFFEE	\$ 26.378.087
MITSUBISHI	\$ 131.890.436
KEIMYUNG CARITAS (SOUTH KOREA)	\$ 12.840.994
DINAMARCA	\$ 130.434.782
USA PEEC	\$ 72.566.250
CARING FOR COLOMBIA	\$ 122.793.200
USTOA	\$ 14.820.000

BOOYOUNG HOUSING CO LTD (SOUTH KOREA)	\$ 294.796.029
LIG NEX1 CO.,LTD.	\$ 59.340.000
TAILANDIA	\$ 292.820.000
GIFU BROADCASTING	\$ 2.641.578
COREA	\$ 871.950.000
WORLD TRADE ORGANIZATION	\$ 9.460.391
HYUNDAI	\$ 293.170.000
COLOMBIANOS EN ALEMANIA	\$ 8.071.446
PERSONAS EN EL EXTERIOR	\$ 172.350.083
GIVE TO COLOMBIA	\$ 173.366.667

Asignación o Compromiso de Recursos

Uniformes estudiantes de Mocoa*	\$	727,593,000
Construcción Colegio de 24 aulas en Sauces II	\$	8,500,000,000
Adquisición del predio para la Fase I de construcción de vivienda Rural	\$	1,907,820,000
Escrituración del Predio Sauces*	\$	9,637,000
Adquisición del predio para la Fase II de construcción de vivienda Rural*	\$	1,185,665,880
Estudios y diseños técnicos para la construcción de la vivienda de interés prioritario (Interventoría) *	\$	1,455,032,040
Asistencia Humanitaria de Emergencia*	\$	569,200,000
Adecuaciones accesos y servicios públicos predio Plaza de Mercado Definitiva*	\$	1,700,000,000
Adquisición de predio para la Plaza de Mercado Definitiva*	\$	400,000,000
Pavimentación de vías urbanas *	\$	5,000,000,000
Mejoramiento de instalaciones Educativas e instalación de equipos *	\$	290,000,000
Laboratorio de ciencia y dotación de la banda de paz del Colegio Ciudad Mocoa	\$	122.793.200
Dotación del Centro de Desarrollo Infantil	\$	173.366.667
TOTAL ASIGNADO	\$	22.041.107.787
POR ASIGNAR	\$	15.287.157.615

- *Estos valores cambian de acuerdo al estudio de mercado y uso de suelo.*
- *Este cuadro es un control interno de seguimiento, los valores pueden variar.*

DONANTE	DESCRIPCIÓN
Amerisur	Contenedor nevera para conservación de cadáveres
Telefónica-Movistar	15 teléfonos Nokia 3500 Negros
Bettina Spitz	7 cajas con prendas de vestir femeninas
DICORP	5 Toneladas de arroz, 582 litros de aceite de palma
Shelterbox	63-Cajas Shelterbox
Global Medic	Mapas e Imágenes de drones de alta precisión
Asecones	10 equipos portátiles de comunicación de dos vías Digital
Gobierno de Japón	30 Generadores eléctricos de 60 Hz
Eduardoño	1 planta eléctrica
Gobierno de Turquía	Medicamentos, 200 kits de aseo básico, 100 lámparas solares
Skinco Gyplac	3 kits de almacenamiento Acuaviva de 6.000L
Terpel	600 galones de ACPM para vehículos y plantas eléctricas
Fundación Éxito	Viveres para Asistencia Humanitaria
Colempaques	421 Tanques de Almacenamiento de Agua 126 canecas plásticas para las viviendas



Donación Colempaques

TOTAL DONACIONES EN ESPECIE
\$668 Millones

SECTOR
VIVIENDA



1.461
Total Viviendas a Construir

1.209 Viviendas Urbanas
252 Viviendas Rurales



Vivienda Urbana

**Fase 1: Construcción de 300 viviendas
(Los Sauces I)**
\$ 22.260 millones

Avance:

- ✓ **99,2%** de avance en la etapa de estudios y diseños.
- ✓ **20,6%** de avance físico de la obra.
- ✓ El contratista de obra realizó la formulación de un Plan de Contingencia para garantizar el cumplimiento del cronograma para la ejecución del proyecto y la entrega de viviendas.

Compromisos:

- Realizar la postulación de las familias beneficiadas.
- Realizar estudio técnico y determinar la viabilidad de los recursos para la instalación de servicios públicos en el predio.- Viceministerio de Agua



Avance de construcción Fase I Vivienda Urbana – Los Sauces I

Tiempo de ejecución: **1 año**
(Mayo 2017- Mayo 2018)

Vivienda Urbana

Fase 2: Construcción de 909 viviendas (Los Sauces II)

\$60.448 millones

Avance:

- ✓ Se realizó la inscripción del acta de posesión del predio en Instrumentos Públicos.
- ✓ Fue perfeccionado el Otrosí N°1 del convenio suscrito entre el FNGRD y Fonvivienda.

Compromisos:

- Continuar con el proceso de contratación de estudios, diseños, obra e interventoría.




Tiempo de ejecución:

1 año y 6 meses
(Diciembre 2017-
Junio 2019)

1. Centro Regional de Atención a Víctimas
 Unidad de Víctimas

2. Colegio Saucés II
 MinEducación-UNGRD
 Estructuración de obra e interventoría Junio 2019.

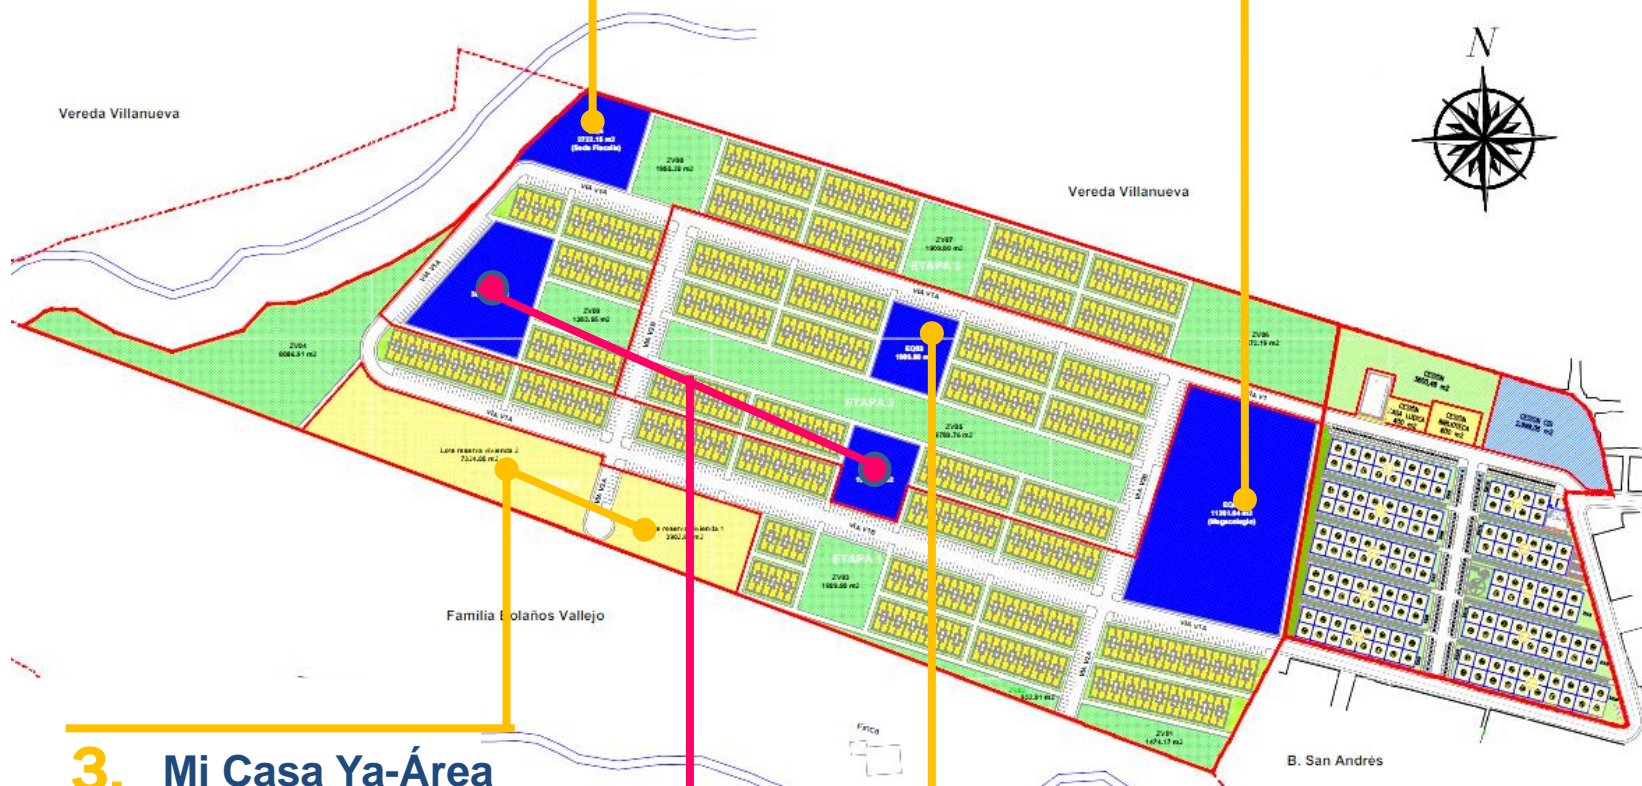

3. Mi Casa Ya-Área Disponible
 MinVivienda

Espacios Disponibles

4. Centro de Integración Ciudadana
 MinInterior
 • Aporte de recursos
 • Revisión de insumos técnicos

Acueducto

Construcción del Sistema de Acueducto- Viceministerio de Agua

\$28.074 millones

Avance:

- ✓ **5.7%** de avance físico en estudios, diseños y obra.
- ✓ **36%** de avance físico en la instalación de redes de acueducto.
- ✓ **5.497** metros lineales instalados de redes de acueducto.
- ✓ En proceso de Consulta Previa por parte del Resguardo Indígena INGA.

Compromisos:

- Redefinición de los diseños de la bocatoma, para inicio de actividades preliminares.



Tiempo de ejecución: 8 meses

Alcantarillado

\$91.200 millones

Avance:

- ✓ Diseños entregados para la vigencia 2018, y ejecución para el 2019 y 2020.
- ✓ En revisión minuta del préstamo con el BID

Construcción Centro de Desarrollo Infantil barrio los Sauces I – MinVivienda

\$ 3.500 millones

Avance:

- ✓ Fase de estudios y diseños finalizada.
- ✓ Se definió que los recursos donados por la organización “Give To Colombia” por valor de **\$173 millones** serán destinados para la **dotación del CDI**.



Compromisos:

- Entregar el cronograma de obra -
MinVivienda

**Fecha de
Finalización:**

Julio de 2018



SECTOR
AGRICULTURA

Vivienda Rural

Construcción de 252 viviendas

\$16.390 millones

Avance:

- ✓ El Ministerio de Agricultura definió realizar el aporte del 100% de los recursos.
- ✓ La Alcaldía definió 3 predios en la Vereda Las Planadas con 26 hectáreas en total, para la ejecución del proyecto.
- ✓ El IGAC entregó el avalúo comercial de los 3 predios de la Vereda Las Planadas- Cabaña 1, Cabaña 2 y Planadas.

Compromisos:

- Realizar el desembolso de los recursos a la UNGRD - Banco Agrario.
- Adquisición de los predios definidos – UNGRD.



Tiempo de ejecución: 1 año y 5 meses

Vivienda Rural

**Mejoramiento de 350 viviendas -
MinAgricultura**

\$ 6.220 millones

Avance:

- ✓ La Alcaldía remitió listado con potenciales familias a ser beneficiadas.

Compromisos:

- Presentar el proyecto en la próxima comisión de vivienda para definir la disponibilidad de recursos para la vigencia 2018 de acuerdo a los “Programas Estratégicos Bolsa Nacional – Agencia Nacional de Desarrollo Rural”.

Activación Sector Agropecuario

Reactivación Económica para 180 familias- Alcaldía y MinAgricultura

\$1.020 millones

Avance:

- ✓ Definición de 180 familias a ser beneficiadas con el proyecto.
- ✓ Definición de proyectos en avicultura, cítricos, plátano, aguacate, asistencia técnica y suministro de herramientas y equipos.
- ✓ Se suscribió convenio entre el FNGRD, MinAgricultura y la Alcaldía.
- ✓ Se encuentra en ejecución el Plan de Asistencia Técnica.

Compromisos:

- Realizar el desembolso de los recursos al FNGRD - Banco Agrario.

Tiempo de ejecución: 6 meses

SECTOR

PROSPERIDAD SOCIAL

Vivienda Urbana

Mejoramiento de 300 viviendas-

Prosperidad Social

\$4.972 millones

Avance:

- ✓ Convenio suscrito con el operador UNOPS.
- ✓ La Alcaldía identificó a 220 familias a ser beneficiadas.
- ✓ Se definieron 3 etapas del proyecto:
 - **1era Etapa:** 120 viviendas. **Duración:** 3,5 meses.
 - **2da Etapa:** 100 viviendas. **Duración:** 3 meses.
 - **3ra Etapa:** 80 viviendas. **Duración:** 2,5 meses.

Compromisos:

- Realizar el desembolso de los recursos a la UNGRD.
- **1era Etapa:** Realizar la socialización del proyecto a la comunidad y determinar la ubicación de las familias. **Plazo:** Enero de 2018.
- **2da Etapa:** Realizar la socialización del proyecto a la comunidad. **Plazo:** Febrero de 2018.
- Entregar las certificaciones de condiciones de habitabilidad de las viviendas de la segunda etapa – Alcaldía.

Construcción Plaza de Mercado Definitiva

\$8.100 millones

Avance:

- ✓ **Fase 1 Preconstrucción:** UNGRD- **Inversión: \$2.100 millones**
- **Componente 1 Expropiación del Predio** – Inversión: \$400 millones.
 - Se realizó la inscripción del acta de posesión del predio en la Oficina de Instrumentos Públicos.
- **Componente 2 Estudios y Diseños** – Inversión: \$1.700 millones.
 - Se determinó que se deben adquirir 2 hectáreas y se deben realizar obras de acceso y de conexiones a servicios públicos.
- ✓ **Fase 2 Construcción:** Prosperidad Social- **Inversión \$6.000 millones**
 - Se suscribió convenio entre Prosperidad Social y la UNGRD.
 - Se da inicio al proceso de contratación del predio.



Compromisos:

- Revisar la infraestructura para instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales- DPS/ UNGRD.
- Determinar la fuente de financiación de la etapa de estudios y diseños, en revisión estructuración convenio con la Universidad Nacional. –UNGRD
- Entregar el listado de comerciantes a ser beneficiados – Alcaldía.

Tiempo de ejecución:

**2 años y 5 meses
(Diciembre 2017
a Marzo de 2020)**

SECTOR
EDUCACIÓN

Infraestructura Educativa

Construcción y mejoramiento de sedes educativas

\$29.000 millones

Avance:

- ✓ Construcción del colegio ubicado en el predio Sauces II – UNGRD con apoyo de Min Educación.
 - Se suscribió convenio entre UNGRD y MinEducación.
 - Más de 3.000 niños a beneficiar.
 - Fecha de inicio de obras: Noviembre de 2017.
 - Fecha de finalización: Marzo de 2019
- ✓ Construcción de 24 aulas en 3 instituciones educativas – MinEducación.
 - Se suscribió convenio con Findeter.
 - Fecha de inicio de obras: Marzo de 2018.
 - Fecha de finalización: Marzo de 2019.
- ✓ Mejoramiento de 9 sedes educativas – MinEducación
 - Se suscribió convenio con Findeter .
 - Fecha de inicio de obras: Junio de 2018.
 - Fecha de finalización: Agosto de 2018.

Compromisos:

- Dar inicio al proceso de contratación de obra e interventoría – UNGRD.

Infraestructura Educativa

Adecuación Colegio Ciudad Mocoa

\$290 millones

Avance:

- ✓ Se realizó la fundición de zapatas para estructura de cubierta y la zona de la tarima.
- ✓ **37%** de avance físico en la adecuación del colegio.
- ✓ Se realizó la formalización de la donación de Caracol TV (Yo me Llamo).
- ✓ Se definió que los recursos donados por la Fundación "Caring For Colombia" por valor de **\$123 millones** serán destinados para la **adecuación del laboratorio de ciencias naturales y de la banda de paz.**

Compromisos:

- Dar inicio al proceso de contratación para adquisición del material académico.



Avance adecuación del Colegio Ciudad Mocoa

SECTOR
CULTURA

OTRAS OBRAS EDUCATIVAS

Construcción Biblioteca- MinCultura- Embajada de Japón

\$ 600 millones

Avance:

- ✓ La Embajada de Japón está encargada de la ejecución de la obra.
- ✓ MinEducación está encargado de la dotación de la Biblioteca.
- ✓ **100%** de avance físico en la adecuación y cerramiento de terrenos.
- ✓ **60%** de avance físico en la construcción.



Avance construcción biblioteca

**Fecha de
Finalización:**

Marzo de 2018

SECTOR
CANCILLERÍA

Construcción Casa Lúdica Los Sauces I

\$ 600 millones

Avance:

- ✓ Los diseños se encuentran en proceso de elaboración.

Fecha de Inicio de las obras:

Enero de 2018

Compromisos:

- Una vez los diseños estén culminados se debe realizar el trámite para obtener la licencia de construcción.- Cancillería.

Fecha de Finalización:

Junio de 2018

Construcción de Espacio Deportivo

\$ 99 millones

Avance:

- ✓ Los diseños fueron culminados.
- ✓ En tramite perfeccionamiento del convenio suscrito entre la UNGRD, FUPAD y la Cancillería.

Fecha de Inicio de las obras:

Enero de 2018

Compromisos:

- Realizar el trámite para obtener la licencia de construcción.- Cancillería.

Fecha de Finalización:

Marzo de 2018

SECTOR

GESTIÓN DEL RIESGO

Construcción de 4 puentes peatonales

\$ 348 millones

Avance:

- ✓ **Puente Mulato:** 100% terminado.
- ✓ **Puente Villa Rosa – San Miguel:** 100% terminado.
- ✓ **Puente Dantayaco:** 100% terminado.
- ✓ **Puente San Agustín:** en proceso de contratación.

Fecha de entrega del Punto: Febrero 2018.



Puente Dantayaco



Puente Mulato



Puente Villa Rosa – San Miguel

Pavimentación de 2.8 Kms de vías

\$5.000 millones

Avance:

- ✓ 4 tramos terminados
- ✓ 1 tramo en ejecución de etapa preliminar con obras de acueducto.
- ✓ 286 metros lineales de vías pavimentadas.
- ✓ 10,7% de avance físico de las obras.

VÍAS:

- **Victoria Regia:** Intervención de 110 ml
Avance físico pavimentación: **100%**
- **Pablo VI:** Intervención de 126 ml
Avance físico pavimentación: **100%**
- **La Brigada:** Intervención de 190 ml
Avance físico obras preliminares: 8%

Compromisos:

- Entregar diseños de 17 vías pendientes de intervención-
Alcaldía.

Tiempo de ejecución:

18 meses
(Octubre 2017 - Marzo 2019)



Instalación del SAT

\$1.223 millones

Avance:

- ✓ **100%** de avance en la implementación del SAT.
- ✓ 1 puesto de monitoreo instalado
- ✓ 11 sensores de río colocados
- ✓ 4 estaciones meteorológicas instaladas

Estudios y diseños SAT

\$600 millones

Avance:

- ✓ **80%** de avance en el estudio realizado con el apoyo de la Universidad Javeriana.

SAT Comunitario

\$205 millones

Avance:

- ✓ **94%** en la implementación del SAT comunitario.
- ✓ 27.800 habitantes a ser beneficiados
- ✓ En proceso de socialización de los Planes Comunitarios a la comunidad.



Mejoramiento Cancha el Pepino y Salón Comunal

\$360 millones

Avance:

- ✓ **98%** de avance físico del proceso de rehabilitación.
- ✓ 3.700 personas a ser beneficiadas

Compromisos:

- Entregar la cancha en el mes de enero de 2018.



Tiempo de ejecución:

3 meses

(Septiembre 2017 a Diciembre 2017)

MEDIOS DE VIDA

Responsable:
UNGRD

INVERSIÓN:
\$ 351 millones

- ✓ **60 medios de vida entregados** para que las familias se reactiven económicamente y activen sus medios de subsistencia.

SUBSIDIOS DE ARRIENDO

Responsable:
UNGRD

INVERSIÓN:
\$ 10.200 millones

7.175 Subsidios otorgados a la fecha
1.485 Primera Prorroga
1.186 Segunda Prorroga

- Se encuentra en proceso la convocatoria para la **tercera prorroga**.

Fecha: desde el 22 al 26 de enero

Ubicación: Coliseo Cubierto

ASISTENCIA HUMANITARIA

1.218 Primera Entrega (Octubre)
1.060 Segunda Entrega (Noviembre)
972 Tercera Entrega (Diciembre)
1.045 Cuarta Entrega (enero)

4.295 kits de asistencia humanitaria

entregados a las familias afectadas y registradas en el RUD, que reciben subsidio de arriendo



SECTOR
INFRAESTRUCTURA VÍAL

4 Puentes Vehiculares

\$9.700 millones

1. Puente sobre la Quebrada San Antonio

- ✓ Fase de estudios y diseños finalizada.
- ✓ **Fecha de inicio de obras:** Febrero 2018
- ✓ **Responsable:** ANI

2. Puente sobre el río Sangoyaco – Av. Colombia


- ✓ Se realizó solicitud de concepto previo al Ministerio de Hacienda para asignación de recursos.
- ✓ **Responsable:** INVIAS
- ✓ **Estado:** **Sin Recursos**

3. Puente sobre el río Sangoyaco – Terminal

- ✓ Se realizó solicitud de concepto previo al Ministerio de Hacienda para asignación de recursos.
- ✓ **Responsable:** INVIAS
- ✓ **Estado:** **Sin Recursos**

4. Puente sobre el río Mulato – Terminal

- ✓ Fase de estudios y diseños finalizada.
- ✓ **1%** de avance físico de la obra
- ✓ **Responsable:** INVIAS

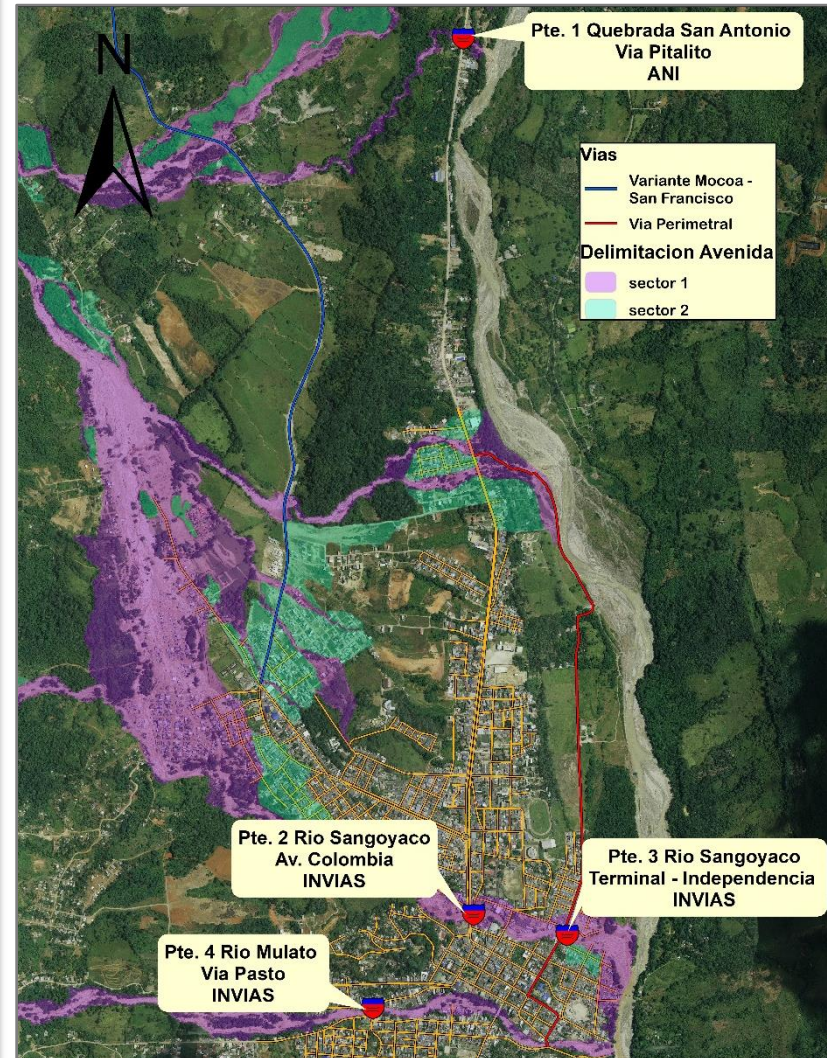

Maquinaria y Equipo

Combo de Maquinaria Amarilla

\$ 5.000 millones

Avance:

- ✓ La Alcaldía realizó priorización de maquinaria amarilla a adquirir, de la siguiente manera:
 - 1 Bulldozer
 - 2 Carrotanques
 - 1 Retroexcavadora
 - 1 Motoniveladora
 - 1 Vibrocompactador
 - 1 Vactor
- ✓ Se realizó la proyección de equipos a adquirir con recursos del FNGRD- UNGRD.

Compromisos:

- Asignación de recursos al INVIAS por valor de \$4.000 millones - MinHacienda.



SECTOR
ENERGIA

Reubicación Subestación Eléctrica

\$45.000 millones

Avance:

- ✓ **Etapla 1- Funcionamiento de operación móvil:**
 - En funcionamiento
- ✓ **Etapla 2- Readecuación subestación Junín:**
 - **30%** de avance físico, representado en limpieza de equipos, reconstrucción de la sala de control y remplazo e instalación de tableros.
- ✓ **Etapla 3 -Construcción de una nueva subestación “RENACER”:**
 - **4%** de avance físico
 - En proceso de elaboración de estudios ambientales.



Compromisos:

- Realizar el cronograma de ejecución del proyecto- MinMinas.

Subsidios al Consumo de Energía Eléctrica

\$462 millones

Avance:

- ✓ Se otorgará por un periodo de **6 meses** subsidios a los damnificados de estratos 1, 2 y 3 registrados en el RUD y que figuren como usuarios de la Empresa de Energía de putumayo (Según Resolución N° 41530 de Dic.de 2017)

SECTOR
TELECOMUNICACIONES

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

\$ 7.100 millones

Avance:

- ✓ Se realizó la entrega de:
 - **3 licencias** de emisoras comunitarias.
 - **226 becas** en TI- competencias técnico laborales
 - **4.500 computadores** para educar
- ✓ Se apoyo en la creación de **318 MiPymes** conformadas en TIC.
- ✓ Se instalaron **4 zonas WIFI**.
- ✓ Se identificaron **11.591 estudiantes** a ser beneficiados de **37 sedes educativas**.

Compromisos:

- **Instalación de 2 zonas WIFI:** Se realizará la entrega en el mes de marzo de 2018.
- **Despliegue de televisión digital terrestre:** Realizar la entrega de 2.500 decodificadores de TDT. **Plazo: Febrero de 2018.**
- **Instalación de punto Vive Digital:** Realizar la instalación de un punto en el Instituto Tecnológico del Putumayo. **Plazo: Junio de 2018.**



SECTOR
SALUD

Construcción y Dotación Hospital José María Hernández

\$ 33.826 millones

Avance:

✓ **33,76%** de avance físico en la obra.



**Fecha de
Finalización:**

Marzo de 2020



Compromisos:

- Definir los proyectos biomédicos a desarrollar.
- Elaborar el cronograma de la obra.
- Establecer la viabilidad de los recursos.

SECTOR
AMBIENTE

Avance:

- ✓ Mesa técnica ambiental en funcionamiento.
- ✓ Corpoamazonia presentó, dentro del marco de la mesa técnica ambiental, la propuesta para financiación de la etapa de estudios y diseños avaluada en \$ 3.000 millones.
- ✓ Se presentó al DNP el proyecto de obras de mitigación y reducción del riesgo, avaluado en \$130 mil millones para revisión.
- ✓ Durante la semana del 15 al 18 de enero el Ministro de Ambiente realizó visita a las zonas afectadas en Mocoa para evaluar y verificar necesidades.



Avance:

- ✓ Se entregaron los estudios de amenaza por movimientos en masa y flujo a escala 1:25000, en las cuencas de las quebradas Taruca, San Antonio y el Carmen, y los ríos Sangoyaco y Mulato.
- ✓ Se entregaron los estudios de amenaza por movimientos en masa y flujo a escala 1:5000 para áreas urbanas y suburbanas.
- ✓ Avances en un 70% en microzonificación sísmica, exposición y riesgo sísmico para el área urbana y suburbana.

Compromisos:

- Entregar fotografías. **Plazo: Enero de 2018.**



SECTOR
PLANEACIÓN

Revisión y ajuste del PBOT + estudios de riesgos

PROGRAMA
**POT
MODERNOS**

Valor:

\$ 4.886* millones

* Incluye estudios de riesgos

Tiempo de
ejecución:

9 meses

Actividades adicionales del DNP

- ✓ **Elaboración del documento CONPES 3904:**

PLAN PARA LA
RECONSTRUCCIÓN
DE
MOCOIA
2017 - 2022

**Valor estimado: \$1.2
billones**

**122 acciones (infraestructura,
desarrollo social, económico
e institucional, conectividad
e integración regional,
ordenamiento territorial)**

- ✓ **Apoyo permanente a la Gerencia**
- ✓ **Apoyo para la actualización del Plan de
Desarrollo Municipal**

- ✓ **11 de diciembre de 2017:** Presentación del Enlace Territorial ante el Concejo Municipal y el gabinete de la Alcaldía (Consejo de Gobierno de Mocoa).
- ✓ **19 de diciembre de 2017:** visita a centros nucleados con INYPSA.
- ✓ **5 de enero a la fecha:** equipo de riesgos en campo recolectando información y visitando las principales fuentes hídricas.
- ✓ **11 de enero de 2018:** socialización de la estrategia de participación con la Alcaldía, ASOJUNTAS e INYPSA.



- ✓ **Otras actividades en curso:**
 - Identificación, recolección y clasificación de la información disponible.
 - Análisis de información básica de riesgos.
 - Consecución y adecuación de la sede en Mocoa.
 - Reuniones semanales con la Alcaldía y Corpoamazonia.

SECTOR
COMERCIO

Recuperación del comercio y la actividad productiva

Reactivación de 170 Negocios formales:

Valor:

\$ 4.250 millones

Tiempo de ejecución:

Primera Fase: 6 a 8 meses
 (Julio 2017 a febrero de 2018)
 Segunda Fase: 6 a 8 meses
 (Noviembre 2017 a junio de 2018)

Avance:

- ✓ \$3.000 Millones en ejecución para 120 Negocios iniciales.. A la fecha solo faltan 20 negocios por terminar entrega de apoyos en equipos, maquinarias e inventario.
- ✓ Está en proceso de contratación un cuarto proyecto para reactivación de 50 negocios adicionales.

Cofinanciación: Bancoldex - FNG

- ✓ Línea de Crédito Bancoldex: **Desembolsos por 16.317 Millones** a intermediarios financieros, representados en 326 operaciones y **más de 2.842 beneficiarios.**
- ✓ Garantías – FNG: \$11.003 millones en 581 créditos garantizados.



Comunidades indígenas:

- ✓ En ejecución: Fortalecimiento productivo y comercial de **5 cabildos. Inversión \$250 Millones.**
- ✓ Encuentro regional de Economías Propias MOCOA – Feria de Negocios del 09 al 11 de Nov/17.
 Comunidad Simuyaco - \$ 20 millones
- ✓ Turismo: Ingresos confirmados por valor de \$60 millones, beneficiando a 150 personas.
